

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
51

Bremen, den 03.06.2013
361 10702 (Frau Schulenburg)
361 10179 (Frau Brinkmann)

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung und Energie (S)

Bericht der Verwaltung
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie
am 13. Juni 2013

Wichtige Baustellen im Straßennetz im Jahr 2013

Der Bericht der Verwaltung über die wichtigsten Baustellen im Straßennetz im Jahr 2013 umfasst alle zurzeit durchgeführten und noch für 2013 vorgesehenen Maßnahmen von besonderer Tragweite.

Als wichtige Baustellen werden die Maßnahmen angesehen, die auf Straßen des sog. Vorbehaltnetzes oder auf Straßen mit großer verkehrlicher Bedeutung durchgeführt werden und sich maßgeblich auf die Baustellenkoordination für das gesamte Jahr 2013 auswirken.

Im Rahmen dieses Berichtes wird über die Tätigkeit, die Bauzeit, die Verkehrsführung während der Bauzeit und über mögliche Abhängigkeiten zu anderen wichtigen Baustellen informiert.

Die Reihenfolge der aufgeführten Maßnahmen richtet sich nach der fachlichen Zuständigkeit.

Weitere Informationen zu Straßenbaumaßnahmen in Bremen sind unter www.vmz.bremen.de zu finden.

Dem Bericht sind 3 Übersichtspläne (Anlagen 1 - 3) beigelegt.

Zuständigkeit ASV 2 (Neubau)

- A 270 – Anschlussstelle St. Magnus

Maßnahme

Erweiterung der Anschlussstelle St. Magnus im südlichen Bereich sowie Neubau der Abfahrrampe.

Bauzeit

Baubeginn ist für Juni 2013 geplant, die Bauzeit beträgt ca. 5 Monate.

Verkehrsführung

Während der Bauzeit wird die Auffahrrampe Fahrrichtung A 27 für ca. 4 Monate gesperrt werden. Alle übrigen Verkehrsbeziehungen bleiben bestehen, jedoch ist mit kurzzeitigen Engstellen zu rechnen.

Abhängigkeit

Eine unmittelbare Abhängigkeit zu anderen wichtigen Maßnahmen besteht nicht.

- Niedersachsendamm – Huckelriede

Maßnahme

Umbau des gesamten Straßenraumes zwischen Habenhausener Landstraße und Roland Klinik.

Bauzeit

Die Maßnahme wird bereits umgesetzt und soll im August 2013 beendet sein.

Verkehrsführung

In einzelnen Bauabschnitten ist eine abschnittsweise Vollsperrung vorgesehen.

Abhängigkeit

Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zur Maßnahme „Umsteigestelle Huckelriede“.

- Umsteigestelle – Huckelriede

Maßnahme

Umbau der Umsteigestelle Huckelriede und der angrenzenden Straßenbereiche der Kornstraße und der Straße Huckelriede (Verbindungsstraße zwischen Kornstraße und Habenhausener Landstraße)

Bauzeit

Die Maßnahme befindet sich derzeit im Bau und wird Mitte 2014 abgeschlossen sein.

Verkehrsführung

Bis Ende Juli besteht eine Vollsperrung der Straße Huckelriede. Für das Jahresende sind abschnittsweise Vollsperrungen der Kornstraße vorgesehen.

Abhängigkeit

Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zur Maßnahme „Niedersachsendamm“.

Zuständigkeit ASV 4 (Erhaltung)

- B 75 – Oldenburger Straße

Maßnahme

Deckensanierung der B 75 (Oldenburger Straße) zwischen Grolland und Varreler Bäke (Niedersachsen).

Bauzeit

Die Bauzeit je Fahrtrichtung beträgt ca. 3 Tage. Die Arbeiten werden zeitgleich zu der Maßnahme „B 75 - Huchtinger Kreisel“ durchgeführt, wodurch keine zusätzliche Vollsperrung der B 75 nötig wird.

Verkehrsführung

Je Fahrtrichtung wird eine Vollsperrung eingerichtet und der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geführt.

Abhängigkeit

Eine unmittelbare Abhängigkeit besteht zur Maßnahmen „B 75 – Huchtinger Kreisel“.

Zuständigkeit ASV 5 (Brückenbau)

- B 75 – Huchtinger Kreisel

Maßnahme

Instandsetzung einer Brücke im Zuge der B 75 über den sog. Huchtinger Kreisel (Huchtinger Heerstraße / Kirchhuchtinger Landstraße). Im Zuge dieser Maßnahme werden die Geländer auf dem Brückenbauwerk der B 75 und die Unterseiten des Bauwerks saniert.

Bauzeit

Baubeginn ist für Ende Juni 2013 geplant, die Bauzeit beträgt ca. 1 Monat. Die Baumaßnahme findet in den Sommerferien statt.

Verkehrsführung

Die Sanierungsarbeiten finden nacheinander je Fahrtrichtung statt. Bei der Vollsperrung einer Fahrtrichtung wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geführt. Im Huchtiger Kreisel ist während der Bauphase mit Einengungen der Fahrbahnen zu rechnen.

Abhängigkeit

Es besteht eine unmittelbare Abhängigkeit zur Maßnahme „B 75 – Oldenburger Straße“.

- A 1 – Brückenbauwerke

Maßnahme

Sanierung der Unterseiten von fünf Brückenbauwerken über die A 1, zwischen der Anschlussstelle Bremen Hemelingen und dem Bremer Kreuz. Es werden in diesem Jahr zunächst die Untersichten in Fahrtrichtung Osten / Hamburg saniert. Die Gegenrichtung soll 2014 saniert werden.

Bauzeit

Der erste Bauabschnitt umfasst die drei Brückenbauwerke (Drebberstr., Olbersstr. und Kluvenhagener Str.) westlich des Mahndorfer Sees. Dieser Abschnitt beginnt Ende Mai und dauert ca. 10 Wochen bis Ende Juli. Im Anschluss daran beginnt der zweite Bauabschnitt mit den Überführungsbauwerken Bollener Landstraße und dem Bauwerk im Bremer Kreuz. Das Bauende für das Bauwerk im Zuge der Bollener Landstraße ist für Mitte September und für das Kreuzungsbauwerk ist das Bauende für Ende November 2013 geplant.

Verkehrsführung

Die Sanierungsarbeiten finden jeweils halbseitig in Fahrtrichtung Osten / Hamburg statt. Nach Fertigstellung erfolgt ein Wechsel auf die andere Seite der Richtungsfahrbahn. Aus diesem Grund können alle Verkehrsbeziehungen der A 1 aufrecht gehalten werden. Der Verkehr auf der Brücke ist von der Maßnahme nicht beeinträchtigt.

Abhängigkeit

Es besteht keine unmittelbare Abhängigkeit zu einer anderen Maßnahme von besonderer Bedeutung.

Zuständigkeit BSAG

- Schwachhauser Heerstraße - Ersatzneubau

Maßnahme

Ersatzneubau von Gleisen der Linie 4 im Bahnkörper der Schwachhauser Heerstraße zwischen Kirchbachstraße und Marcusallee auf einer Länge von 3,6 km.

Bauzeit

Der Baubeginn ist für die 24 KW, 2 Wochen vor Beginn der Sommerferien im Juni 2013, geplant. Die Bauzeit beträgt ca. 8 Wochen. Am 12.08.2013 wird der Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen.

Verkehrsführung

Es werden abschnittweise Sperrungen einer Fahrtrichtung vorgenommen und Umleitungen eingerichtet. Die jeweils andere Fahrtrichtung wird aufrecht gehalten. Während der Bauzeit wird für die Linie 4 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Abhängigkeit

Es besteht keine unmittelbare Abhängigkeit zu einer anderen wichtigen Maßnahme.

Zuständigkeit SWB

- Malerstraße - Erneuerung der Fernwärmeleitung

Maßnahme

Aufgrund von vermehrt aufgetretenen Schäden an der Fernwärmeleitung in der Malerstraße im letzten Winter 2012/2013 ist die Erneuerung der Fernwärmeleitung zur Sicherstellung der Versorgung des Bremer Ostens (einschl. Mercedes Benz) von besonderer Dringlichkeit.

Bauzeit

Der Baubeginn ist für Anfang Juni 2013 geplant, so dass die Maßnahme Ende September 2013, zum Beginn der Heizperiode, abgeschlossen sein muss.

Verkehrsführung

Die Maßnahme besteht aus drei Bauabschnitten. In jeder Bauphase werden die Fahrbeziehungen aufrecht gehalten. Dazu ist eine Reduzierung der Fahrstreifenanzahl notwendig. Lediglich im letzten Bauabschnitt ist kurzzeitig das Linksabbiegen von der Malerstraße auf den Hastedter Osterdeich nicht möglich.

Abhängigkeit

Es besteht eine unmittelbare Abhängigkeit zur Maßnahme „Bennigsenstr. – Erneuerung eines Schachtbauwerkes“.

Zuständigkeit hanseWasser

- Bennigsenstraße - Erneuerung eines Schachtbauwerkes

Maßnahme

Erneuerung des Schachtbauwerkes in der Kreuzung Bennigsenstraße / Stresemannstraße.

Bauzeit

Die Bauzeit ist von Anfang September 2013 bis Ende Oktober 2013 geplant.

Verkehrsführung

Im ersten Bauabschnitt ist das Linksabbiegen im Kreuzungsbereich für alle Fahrrichtungen unterbunden sowie das Geradeausfahren von der Bennigsenstraße über den Kreuzungsbereich Richtung Süden. Im Zweiten Bauabschnitt ist zusätzlich das Befahren der Bennigsenstraße im Kreuzungsbereich in nördlicher Richtung nicht möglich. Während beider Bauabschnitte werden zwei Umleitungen eingerichtet sein. Östlich der Baustelle wird der Verkehr ab der Steubenstraße über die Stresemannstraße, die Ludwig-Quidde-Straße, die Hastedter Heerstraße bis zur Bennigsenstraße geführt (U2). Im westlichen Bereich führt die Umleitung U3 ab der Georg-Bitter-Straße über die Straße Bei den Drei Pfählen, die Stader Straße bis zur Bismarckstraße.

Abhängigkeit

Es besteht eine unmittelbare Abhängigkeit zur Maßnahme „Malerstraße– Erneuerung der Fernwärmeleitung“.

Beschlussvorschlag:


Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S) nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Anlage 1 Lageplan Bremen Nord

Anlage 2 Lageplan Bremen Süd

Anlage 3 Lageplan Bremen Ost

Anlage 2 Lageplan Bremen Süd

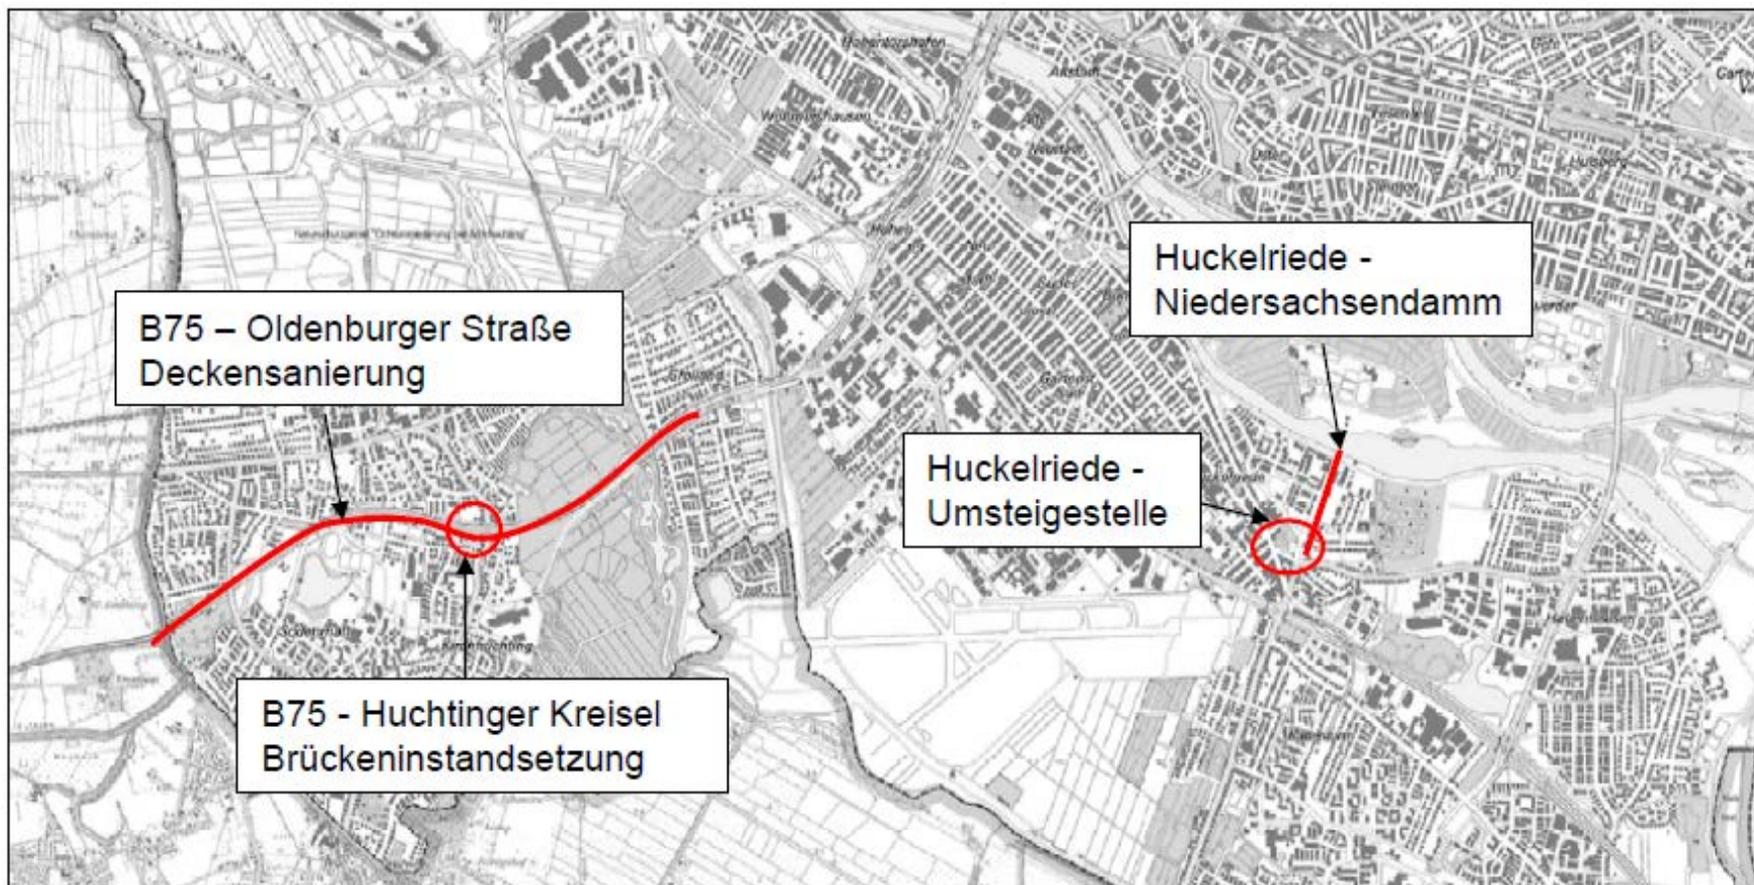

Anlage 3 Lageplan Bremen Ost

