

Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)

**Bericht der Verwaltung
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
am 21. Februar 2019**

Wichtige Baustellen im Straßennetz in Bremen und umzu für das Jahr 2019

Sachdarstellung

Der Bericht der Verwaltung über die wichtigsten Baustellen im Straßennetz für das Jahr 2019 umfasst die bislang für dieses Jahr angemeldeten und/ oder bereits begonnenen Baumaßnahmen von besonderer Relevanz, jedoch in noch nicht abgestimmter bzw. angeordneter Form.

Als wichtige Baustellen werden die Baumaßnahmen angesehen, die auf Straßen des sogenannten Vorbehaltsnetzes oder auf Straßen mit großer verkehrlicher Bedeutung durchgeführt werden und maßgeblich durch die Baustellenkoordination im Jahr 2019 koordiniert werden.

Für das Jahr 2019 wurden bislang 238 Baumaßnahmen angemeldet, wobei pro Jahr ca. 1.200 Anordnungen allein für das Vorbehaltsnetz ausgestellt werden.

Das Ziel der Baustellenkoordination ist es, durch eine enge Abstimmung mit den einzelnen Antragstellern, alle angemeldeten Baumaßnahmen in einem optimierten Rahmen durchführen zu können und durch terminliche Gliederung aufeinander abzustimmen.

Hierfür wurden 2016 mit dem Ziel der Erhöhung der Vorlaufzeit für eine Koordinierung der Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde beim Amt für Straßen und Verkehr sowohl die Bearbeitungsfristen als auch die Reihenfolge der Antragstellung verändert. Dieses Vorgehen hat sich positiv auf die Zusammenarbeit und die Koordinierung von Baumaßnahmen ausgewirkt, so dass es 2019 fortgeführt wird.

Zur Erinnerung: Seit Februar 2016 müssen alle Anträge zur Sicherung einer Arbeitsstelle für die terminliche Prüfung zuerst bei der Baustellenkoordination eingereicht werden. Im Anschluss erfolgt die weitere Prüfung durch die Verkehrsbehörde. Gleiches gilt für Änderungs- und Verlängerungsanträge.

Nach der Anmeldung der Baumaßnahmen durch die einzelnen Antragsteller erfolgt die erste Zusammenstellung. Hier werden mögliche Abhängigkeiten oder terminliche Überschneidungen festgestellt, die in Abstimmungsterminen besprochen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Bauabläufe und mögliche Folgen wie Sperrungen von Fahrspuren und/ oder Umleitungsstrecken aufgrund von Sperrungen meistens noch nicht definiert und werden erst in weiteren Gesprächsrunden festgelegt.

Unvorhersehbare Umstände, wie zum Beispiel Änderung der Witterung oder Notmaßnahmen, können zu weiteren Veränderungen der terminlichen Abfolge führen.

Im Rahmen dieses Berichtes mit anliegender Präsentation wird über die Tätigkeit, die Bauzeit, die Verkehrsführung während der Bauzeit informiert.

Weiteres Vorgehen:

Die hier aufgeführten Baumaßnahmen befinden sich wie oben beschrieben noch im Planungsprozess, so dass es aufgrund zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannter Faktoren ggf. nicht zu einer Umsetzung kommen kann bzw. zeitliche Verschiebungen möglich sind. Somit erfolgt die Darstellung teilweise nur mit Nennung der Baumaßnahme ohne genaue zeitliche Festlegung. Dennoch werden diese Baumaßnahmen in dem Abstimmungsprozess und somit auch in diesem Bericht berücksichtigt, um eventuelle Abhängigkeiten zu koordinieren.

Präsentation (Anlage):

Die Reihenfolge der Darstellung der Baumaßnahmen in der anliegenden Präsentation richtet sich nach der örtlichen Lage innerhalb Bremens und den angemeldeten Bauterminen.

In diesem Jahr liegen die Schwerpunkte der angemeldeten Baumaßnahmen:

- im Innenstadtbereich und umzu (besonders Walle und B 6/ B 75)
- BAB 1 und 27 mit B 6/ B 75 inkl. Autobahnzubringer (ABZ) Arsten und Hemelingen
- Detailplan Juli/ August 2019 für die B 75 und Huchting/ Stuhr mit der Baumaßnahme der Baumaßnahme der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau Verkehr Vollsperrung „Haferflockenkreuzung“

In den anderen Stadtteilen wurden weitere Baumaßnahmen angemeldet, jedoch nicht in dieser gebündelten Anzahl, so dass sich dieser Bericht mit Präsentation auf die bislang ersichtlichen Koordinierungsschwerpunkte bezieht.

Weitere und aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen in Bremen sind unter www.vbz.bremen.de zu finden.

Weiteres Vorgehen:

Abstimmungen und Festlegung der Reihenfolge für Baumaßnahmen, die sich terminlich überschneiden.

Beschlussvorschlag:

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Baustellenverzeichnis 2019

Vorstellung der angemeldeten, relevanten Baumaßnahmen

Stand 19. Februar 2019

Was wird koordiniert?

Alle Baumaßnahmen im Straßenraum von Vorrangstraßen, ÖPNV-Trassen, Innenstadt und Bundesfernstraßen werden in der Baustellenkoordination bei SUBV koordiniert. Dazu gehören auch Hochbaumaßnahmen, deren Baustelleneinrichtung und Abwicklungen dieses Netz betreffen.

Zusätzlich zu beachten sind Einschränkungen durch:

- Großereignisse (Osterwiese, Freimarkt, Vorweihnachtszeit ...)
- Schulferien (weniger Kfz-Verkehr innerorts)
- Bundesligaspiele, Messen
- Witterung (April – Oktober)
- Kapazitäten der Vorhabenträger
- Marktsituation im Baugewerbe
- Notmaßnahmen (i.d.R. Leitungsträger)
- Umleitungsstrecken (für andere Baumaßnahmen)

Ziele der Baustellenkoordinierung:

- Sicherstellung des Verkehrsflusses auf öffentlichen Straßen sowie die Erreichbarkeit von Bremen.
- Zeitliche Abstimmung von Baumaßnahmen untereinander, mit dem Ziel, negative Auswirkungen für die Bürger und die Wirtschaft zu vermeiden oder aber zu reduzieren.
- Vermeidung von Umleitungsverkehren, die die Verkehrsteilnehmer von einer Baustelle in eine weitere Baustelle führen.
- Baustellen auf den Hauptrouten zur Bremer Innenstadt im Weihnachtsgeschäft vermeiden.


Arbeit der Baustellenkoordinierung:

1. Erfassung aller im betreffenden Jahr angemeldeten geplanten Baumaßnahmen im Hauptstraßennetz einschließlich der durch den Maßnahmenträger beabsichtigen Eingriffe in den öffentlichen Verkehr. Dazu erfolgt eine Abfrage bei allen Maßnahmenträgern. Erfahrungsgemäß werden ca. 30% der späteren Baumaßnahmen darüber angemeldet.
2. Zusammenstellung aller angemeldeten Baumaßnahmen in einer graphischen Übersicht mit Erfassung der geplanten zeitlichen Umsetzung. Ziel: Identifikation von Konflikten.
3. Bericht in der Baudeputation zu den gemeldeten Baustellen 2019 als Momentaufnahme, da sich im Zuge der parallel laufenden Koordinierungsgespräche Anpassungen und Verschiebungen ergeben können.
4. Anschließend Herausfiltern von Maßnahmen, deren parallele Umsetzung eine gegenseitige Beeinflussung nach sich ziehen, bzw. die Erreichbarkeit und den Verkehrsfluss nachhaltig beeinträchtigen.

Arbeit der Baustellenkoordination:

5. Durchführung von diversen Koordinierungsgesprächen mit den betreffenden Maßnahmenträgern bzw. deren Projektleitern, mit dem Ziel, die Maßnahmen so aufeinander abzustimmen, dass die verkehrliche Erreichbarkeit gesichert wird. Die Koordination kann auch dazu führen, dass Maßnahmen auf Grund der erheblichen Auswirkungen bzw. Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen verschoben werden oder der Bauablauf angepasst werden müssen.
6. Kontinuierliche Bearbeitung der im Laufe des Jahres eingehenden Anträge auf Einrichtung von Baustellen und Überprüfung von möglichen Wechselwirkungen mit anderen geplanten und angemeldeten Maßnahmen.
7. Unvorhersehbare Umstände, wie zum Beispiel Änderung der Witterung oder aber Notmaßnahmen, können zu weiteren Veränderungen der ursprünglichen terminlichen Abfolge von Baumaßnahmen führen. Das Baustellenverzeichnis wird daher ständig fortgeschrieben, um Notmaßnahmen (z.B. defekte Versorgungsleitungen oder beschädigte Brücken) mit geplanten Maßnahmen in Einklang zu bringen.

Schema der Baustellenabstimmung in Bremen:

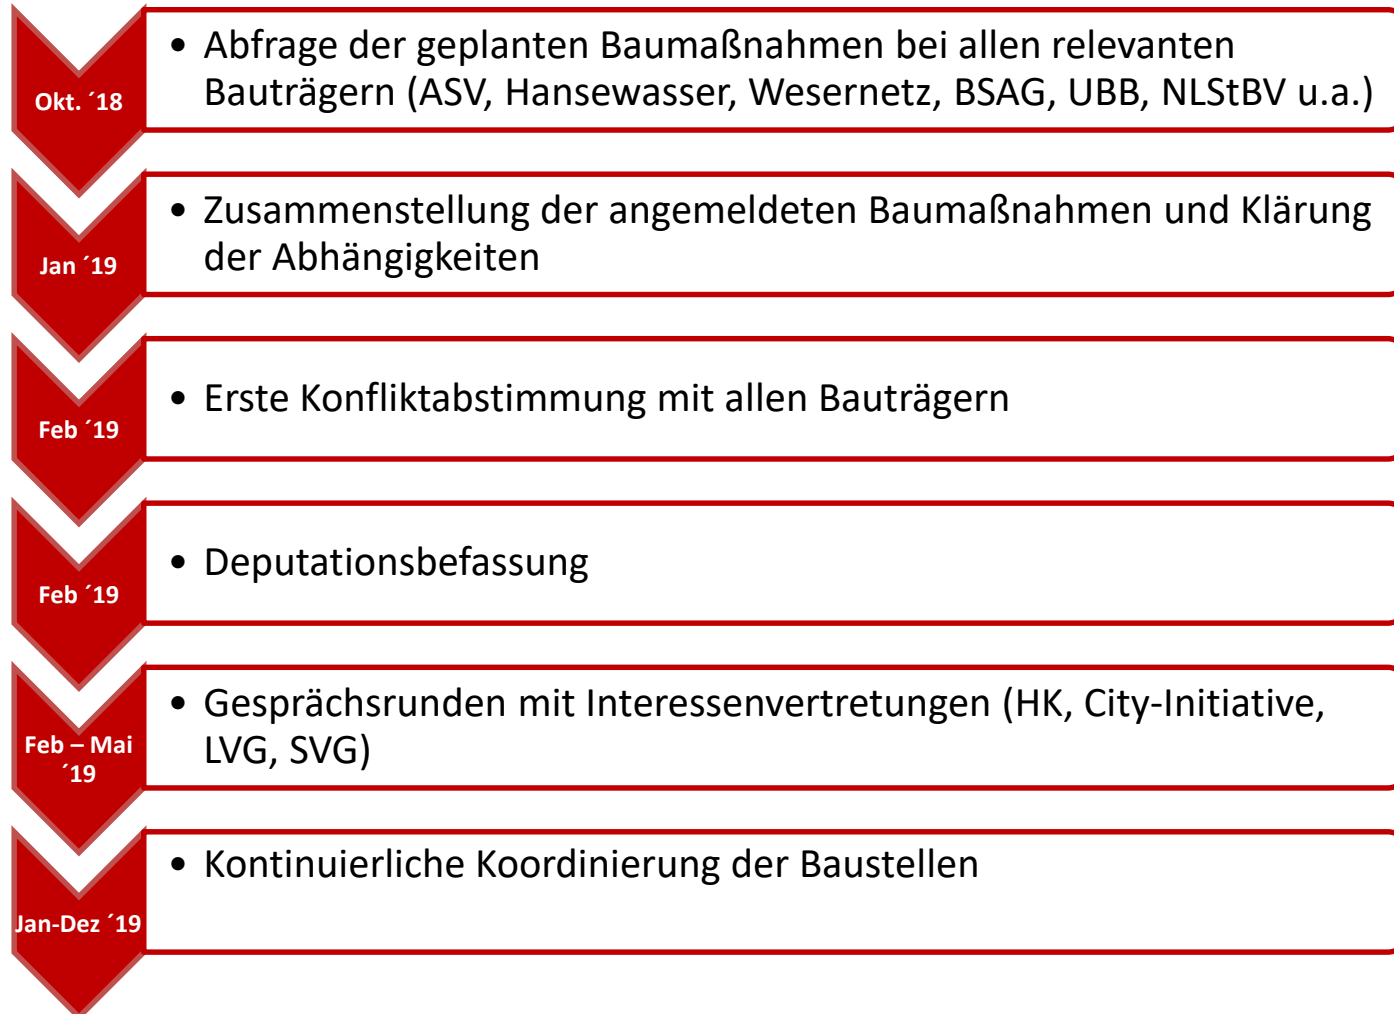

Überblick angemeldeter Baumaßnahmen 2019

- Innenstadtbereich und umzu (besonders Walle und B 6/ B75)
- BAB 1 und 27 inklusive Baumaßnahmen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen und Verkehr (NLStBV) mit B 6/ B 75

In der folgenden Präsentation werden einige bislang angemeldeten Baumaßnahmen als graphische Übersicht nach Terminen und Örtlichkeit dargestellt.

Teilweise wurden nur pauschale Zeiträume vorgemerkt, die in weiteren Abstimmungsterminen näher erläutert werden müssen.

Andere angemeldete Baumaßnahmen befinden sich größtenteils noch in der Abstimmungs- bzw. Planungsphase, wodurch die angegebenen Termine noch nicht verbindlich sind.


Im weiteren Vorgehen werden einzelne Termine mit den Betroffenen abgestimmt.

Abkürzungsverzeichnis

ABZ	Autobahnzubringer
ASV	Amt für Straßen und Verkehr Bremen
A-WE	Aktions-Wochenende
B	Bundesstraße
BAB	Bundesautobahn
Bel	Beleuchtung
BW	Bauwerk
CUX	Cuxhaven
dWiSta	dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinfos
Hauptfahrspur	rechter Fahrstreifen (-spur)
H/ HB/ HH	Hannover/ Bremen/ Hamburg
HST	Haltestelle (BSAG)
KP	Knotenpunkt
LSA	Lichtsignalanlage
NWK	Nord-West-Knoten (B 6)
Ri	Richtung
RiFa	Richtungsfahrbahn
SA/ SE	stadtauswärts/ stadteinwärts
VS	Vollsperrung
WE	Wochenende
4+0-Führung	Führung des Verkehrs jeweils 2 Spuren je Richtung auf einer Fahrbahnseite, die andere Seite ist Vollgesperrt als Baustelle


Innenstadtbereich und umzu (besonders Walle und B 6/ B 75)

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

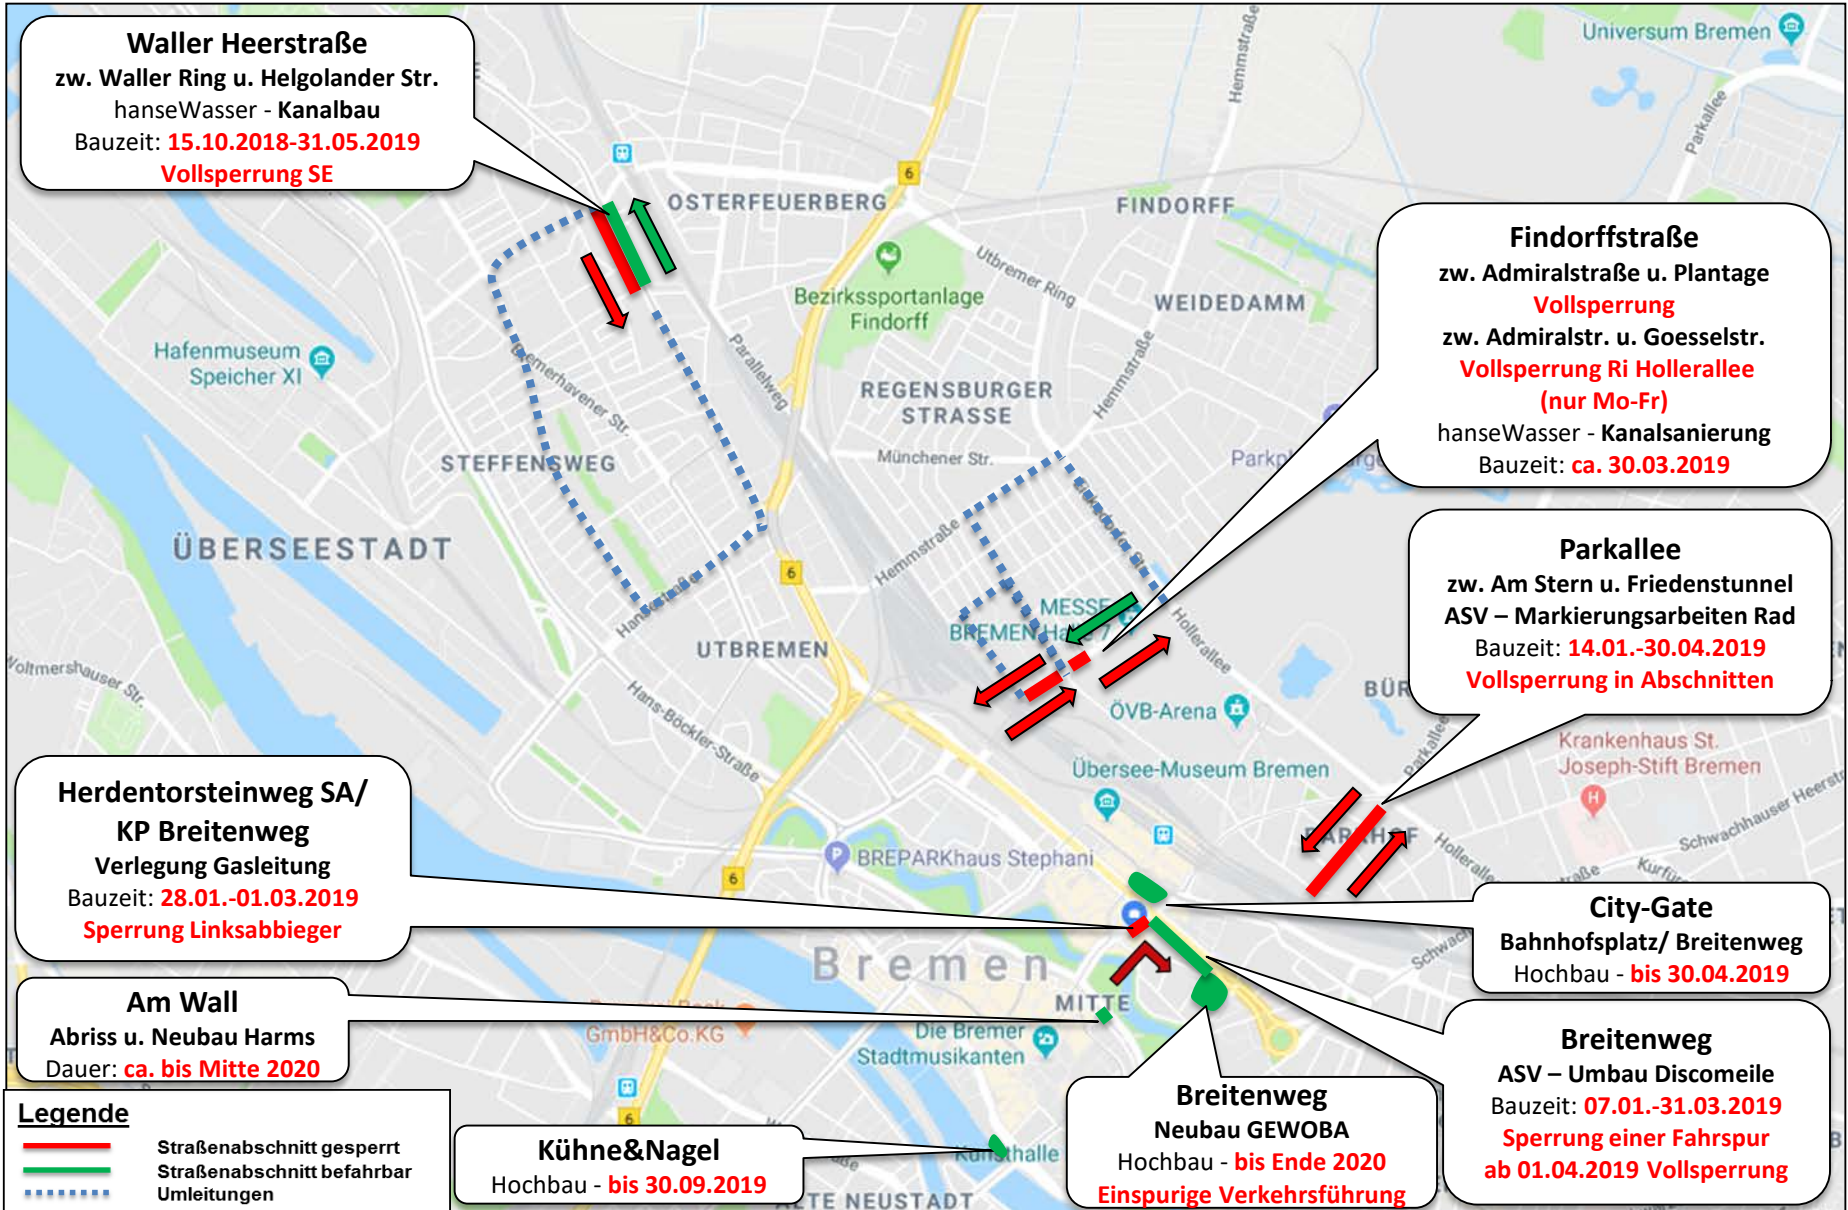

Baumaßnahmen bereits im Bau

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

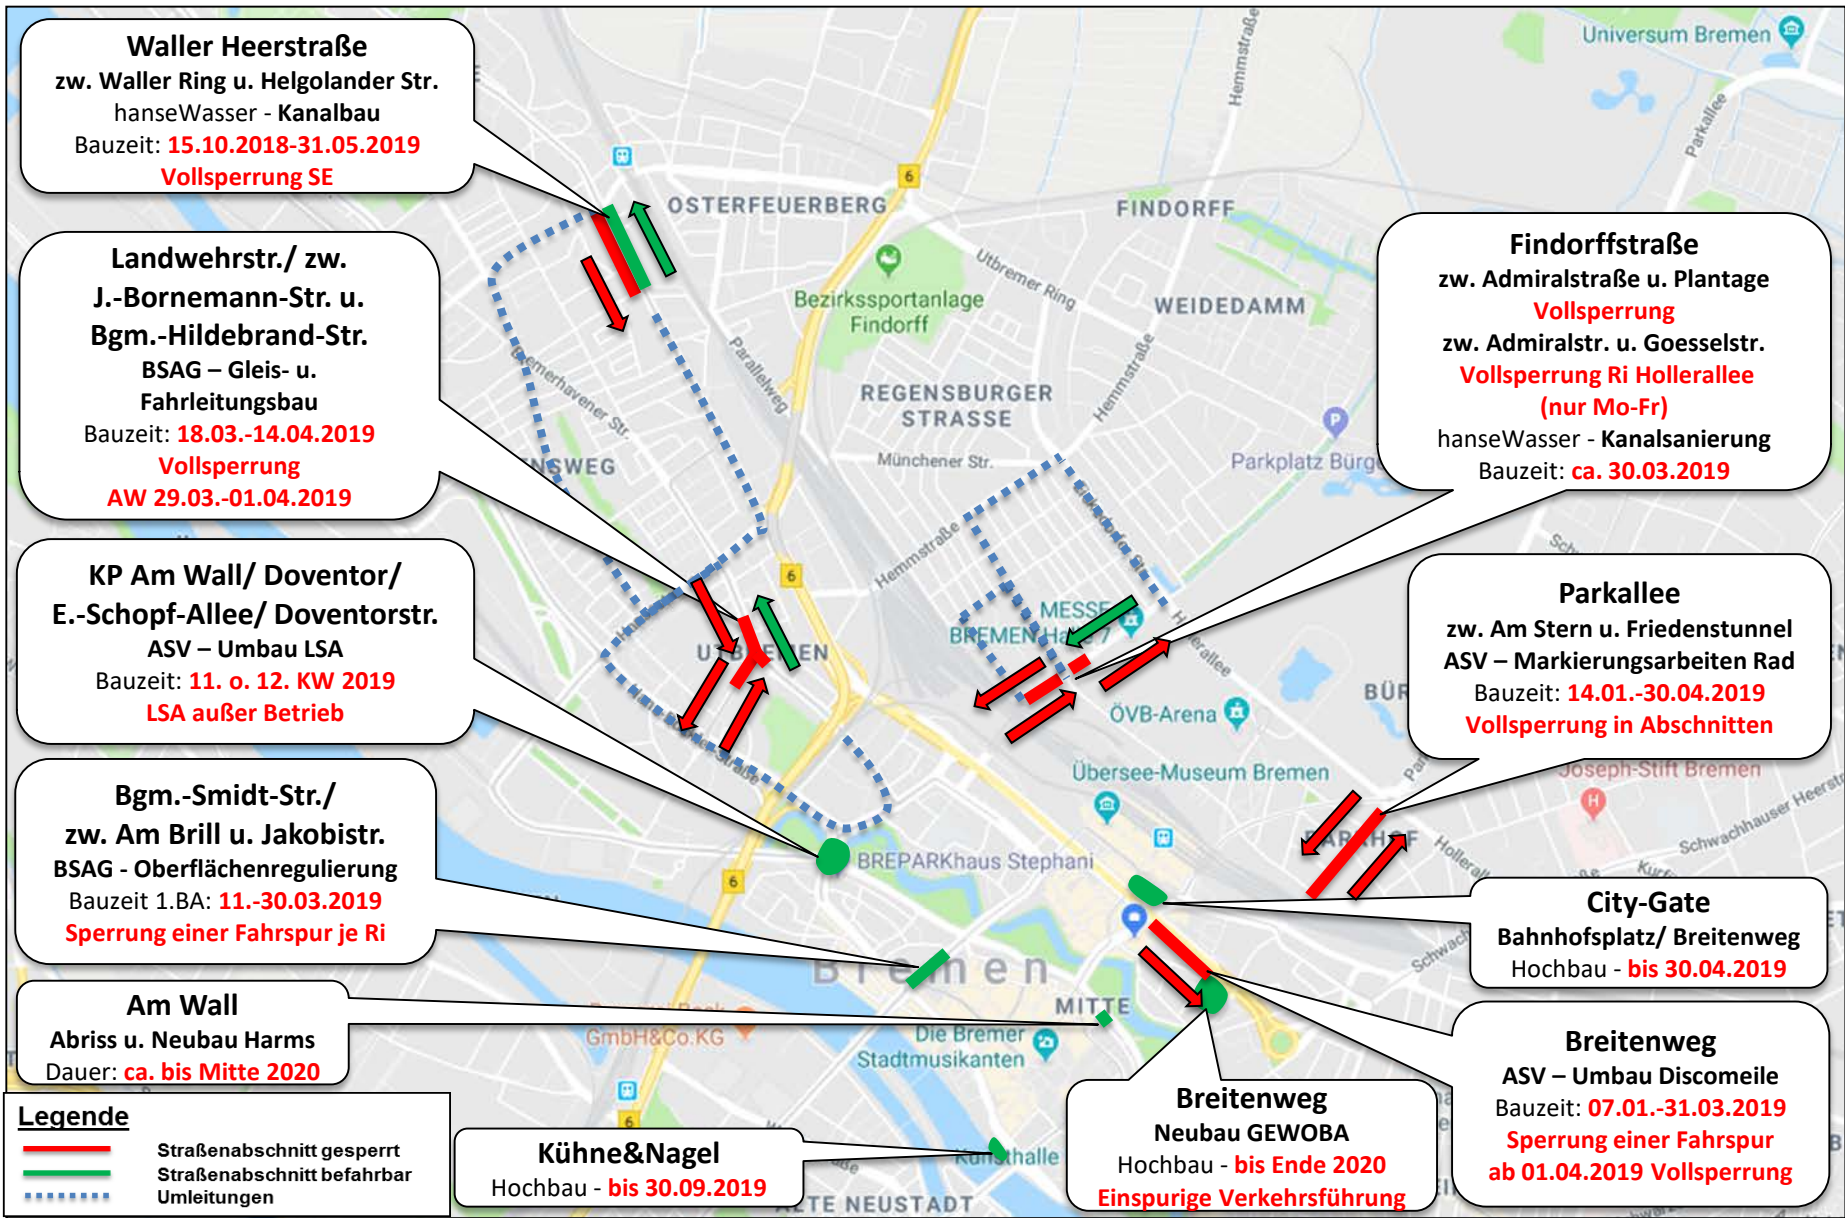


Legende


- ▬ Straßenabschnitt gesperrt
- ▬ Straßenabschnitt befahrbar
- ⋯ Umleitungen

Baumaßnahmen ab März 2019

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

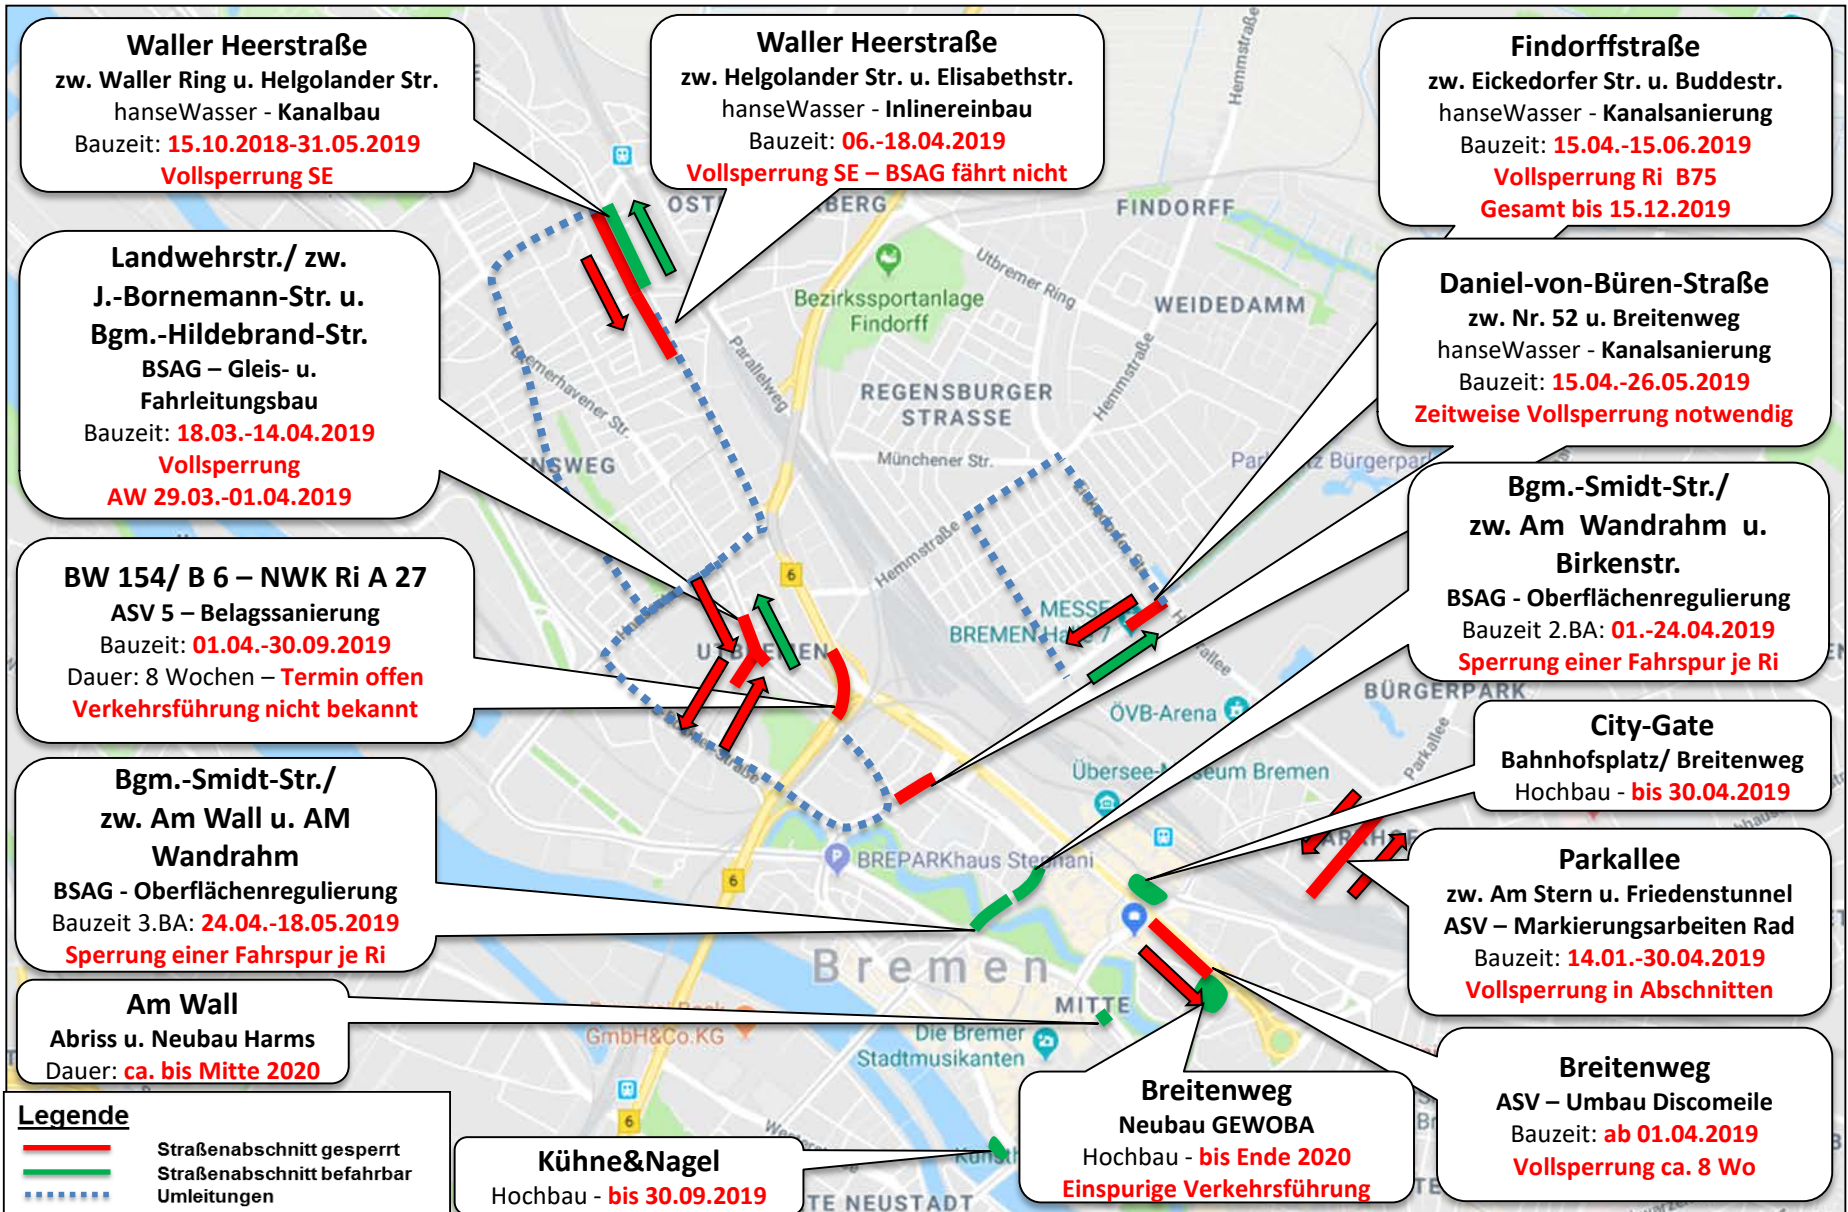


Baumaßnahmen ab April 2019
(Osterferien 06.-23.04.2019 + Osterwiese 12.-28.04.2019)

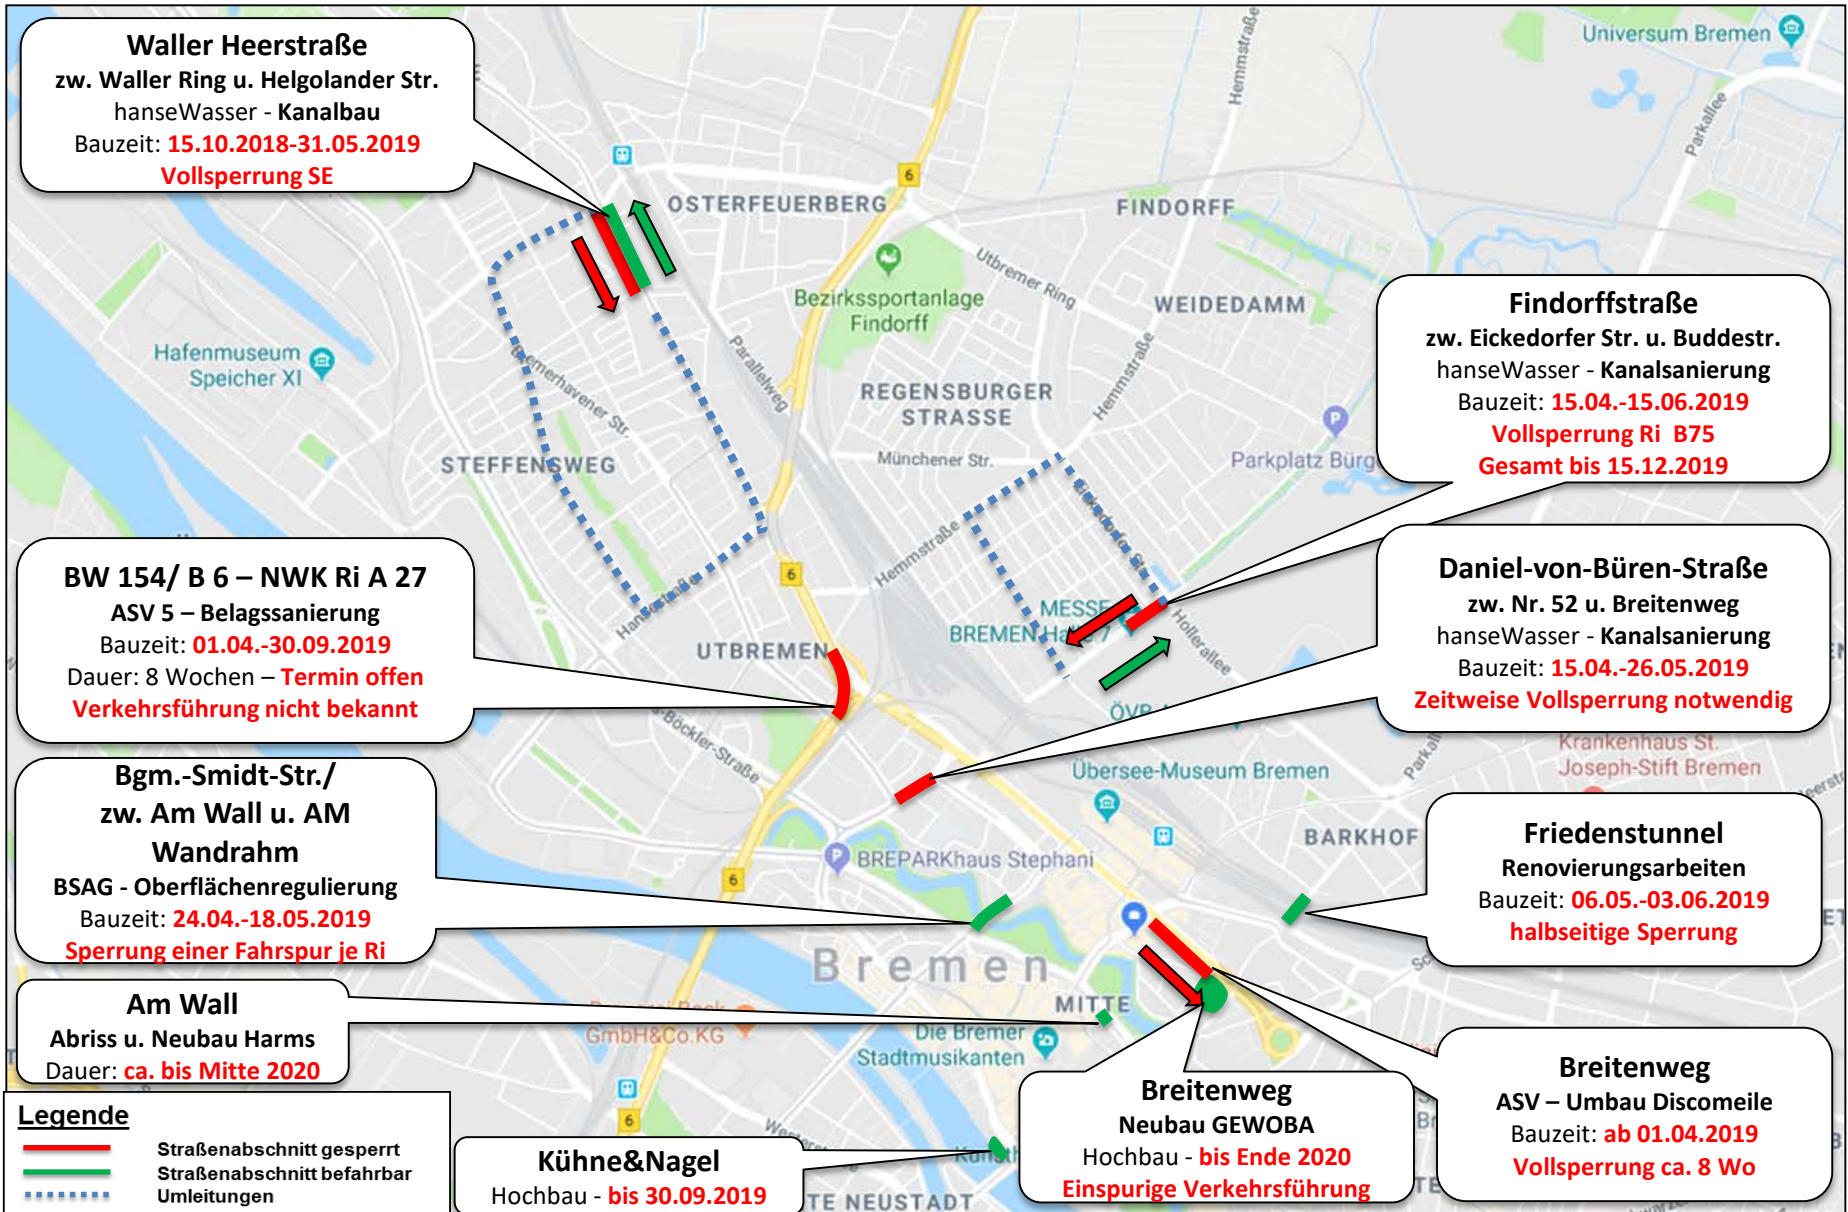


Baumaßnahmen ab Mai 2019

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

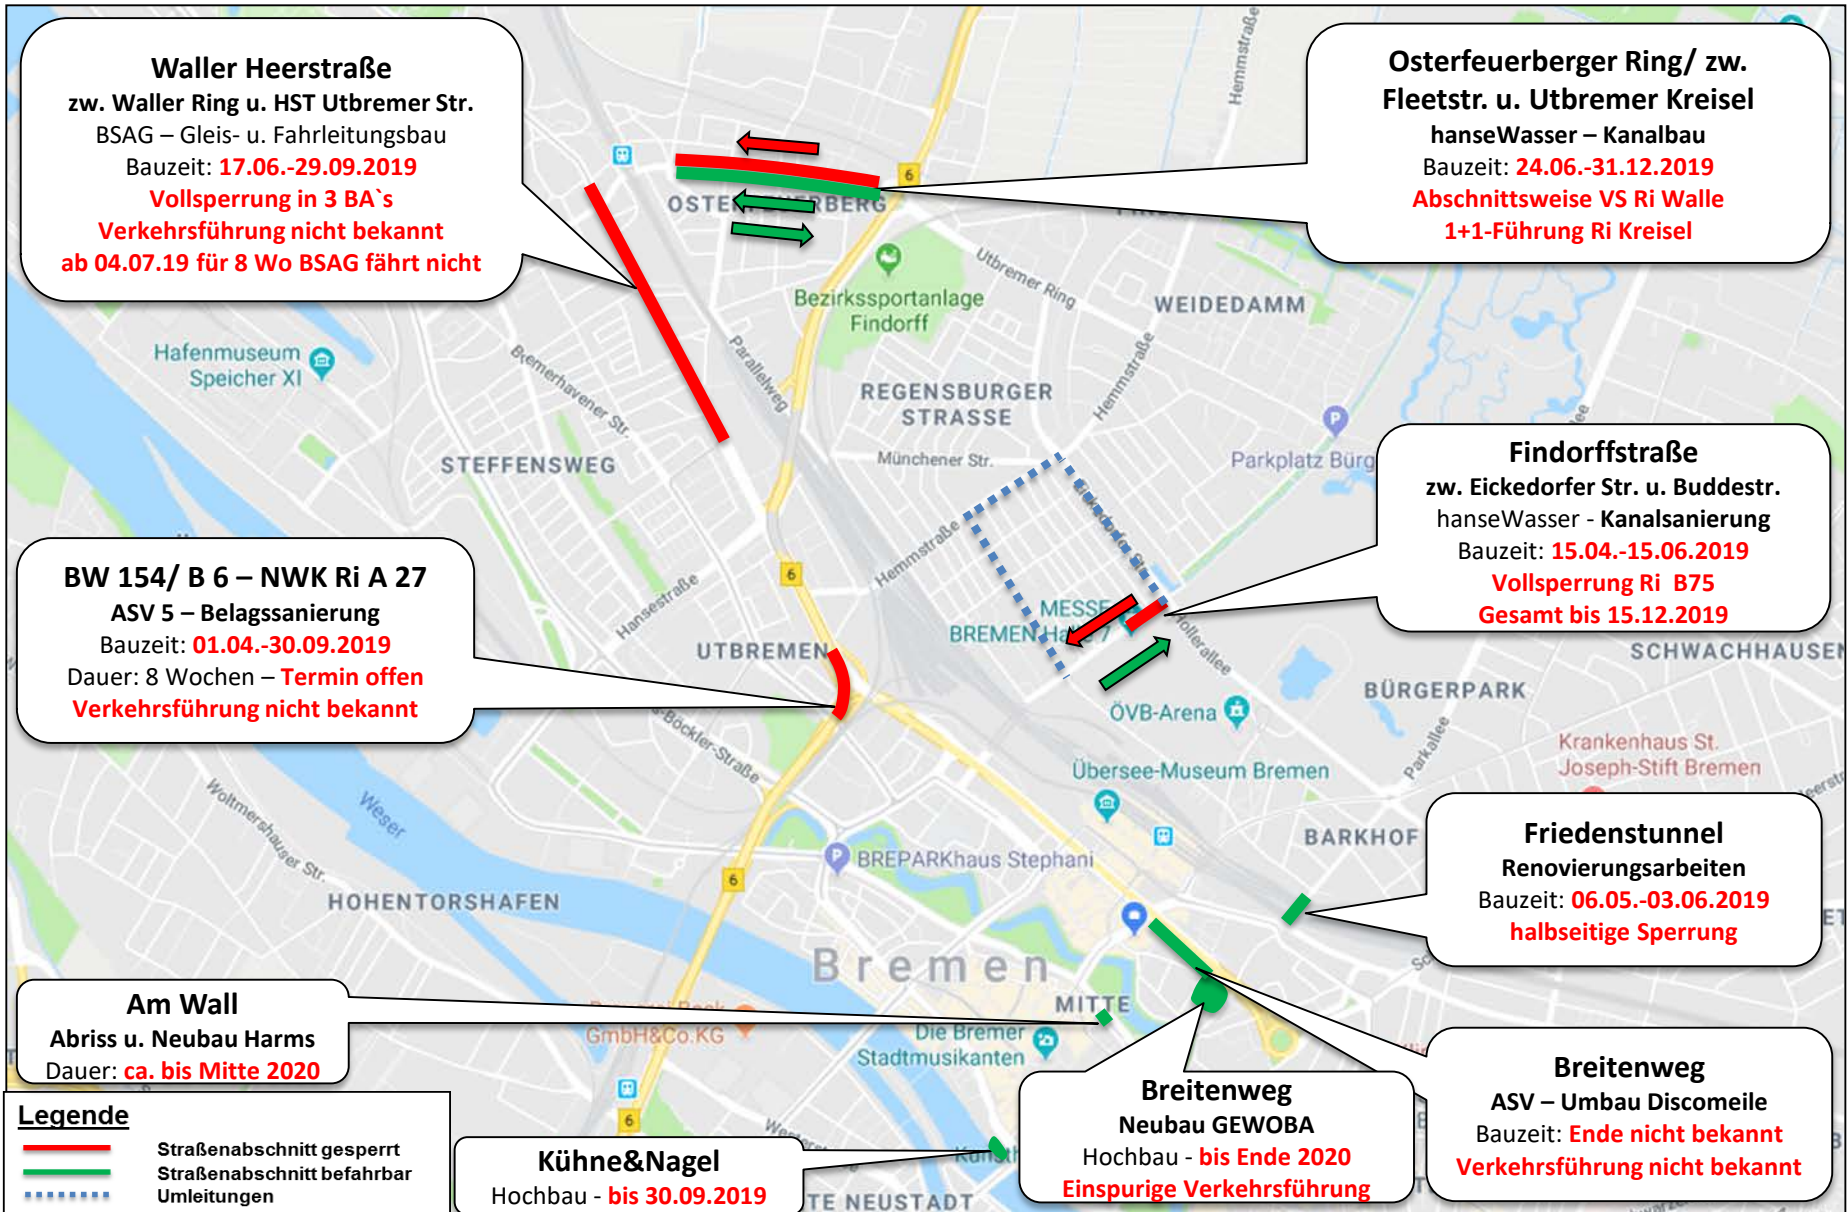


Baumaßnahmen ab Juni 2019

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

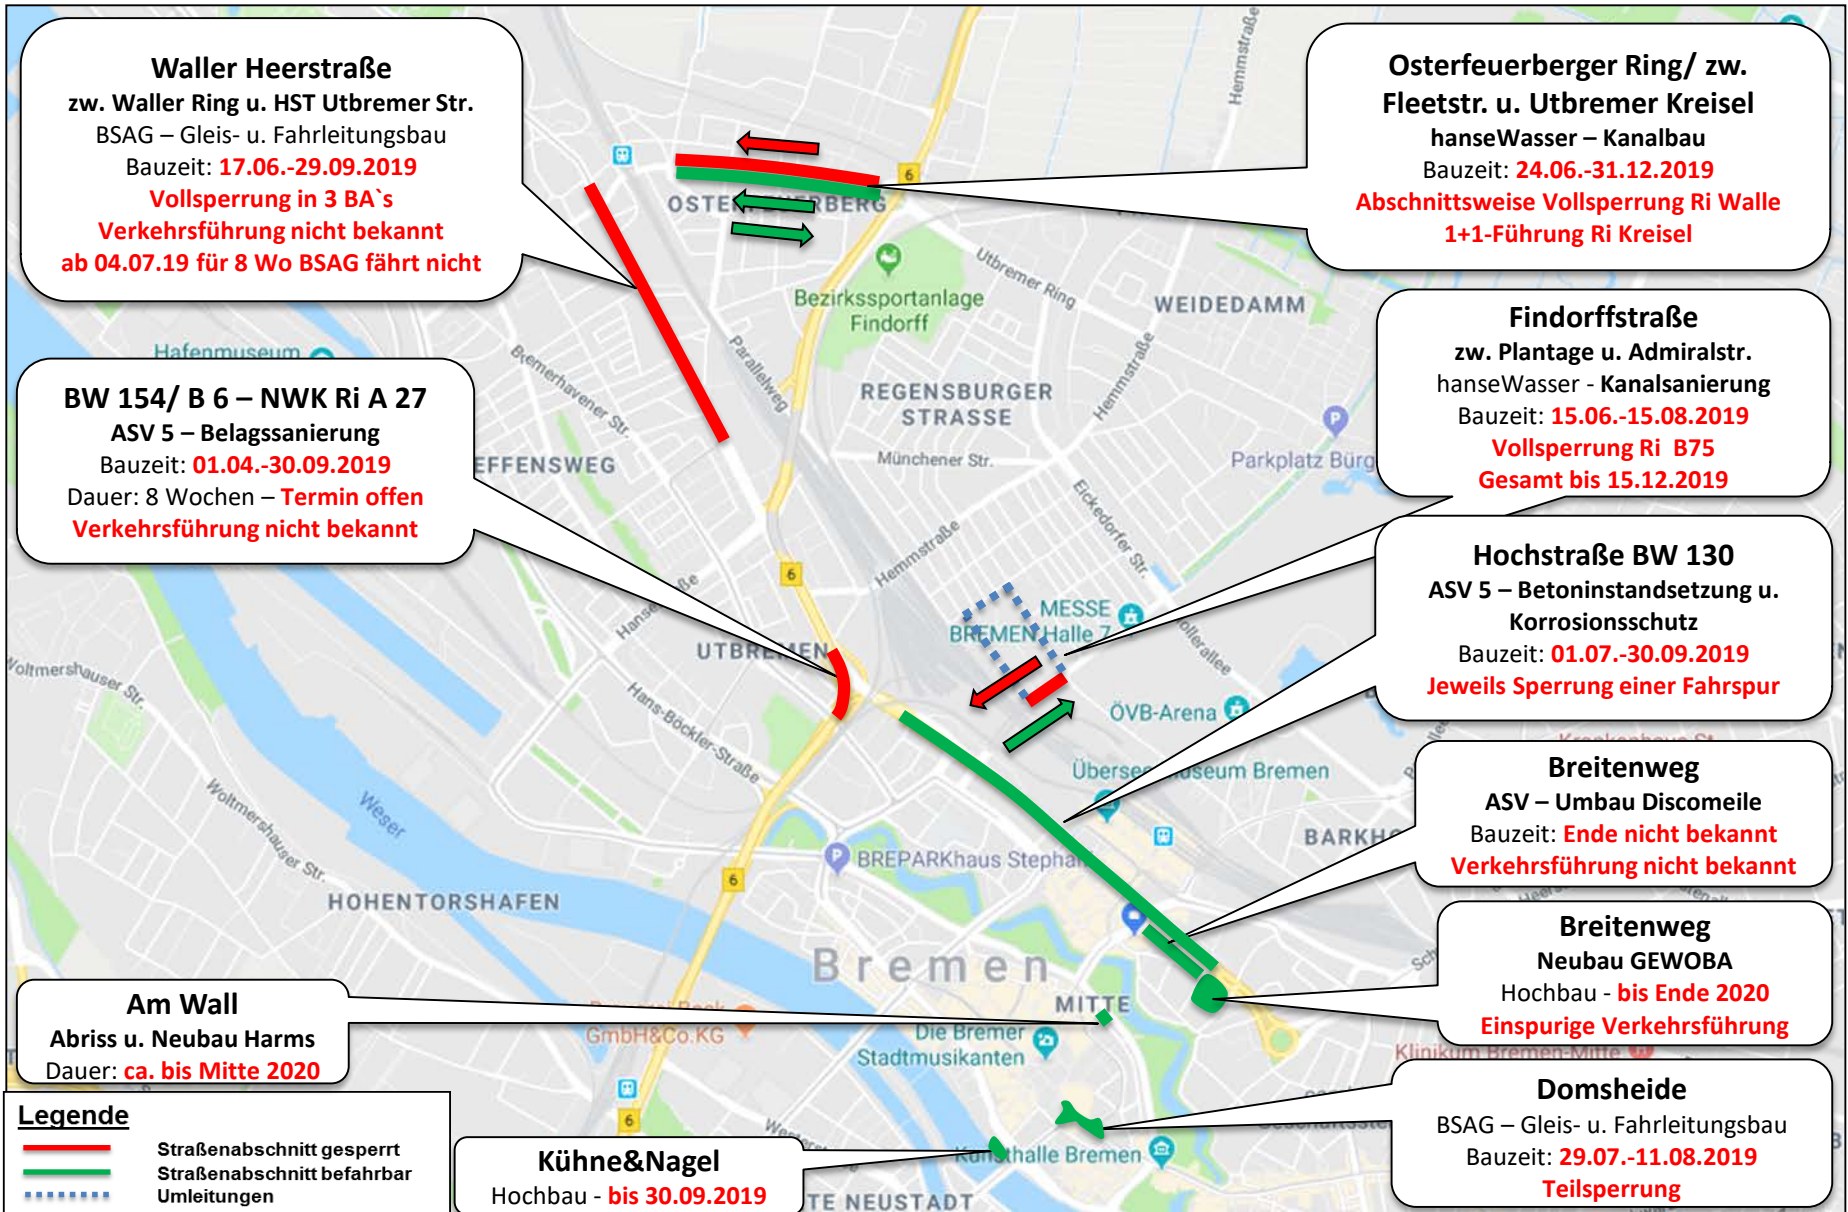


Baumaßnahmen ab Juli 2019
(Sommerferien 04.07.-14.08.2019)

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

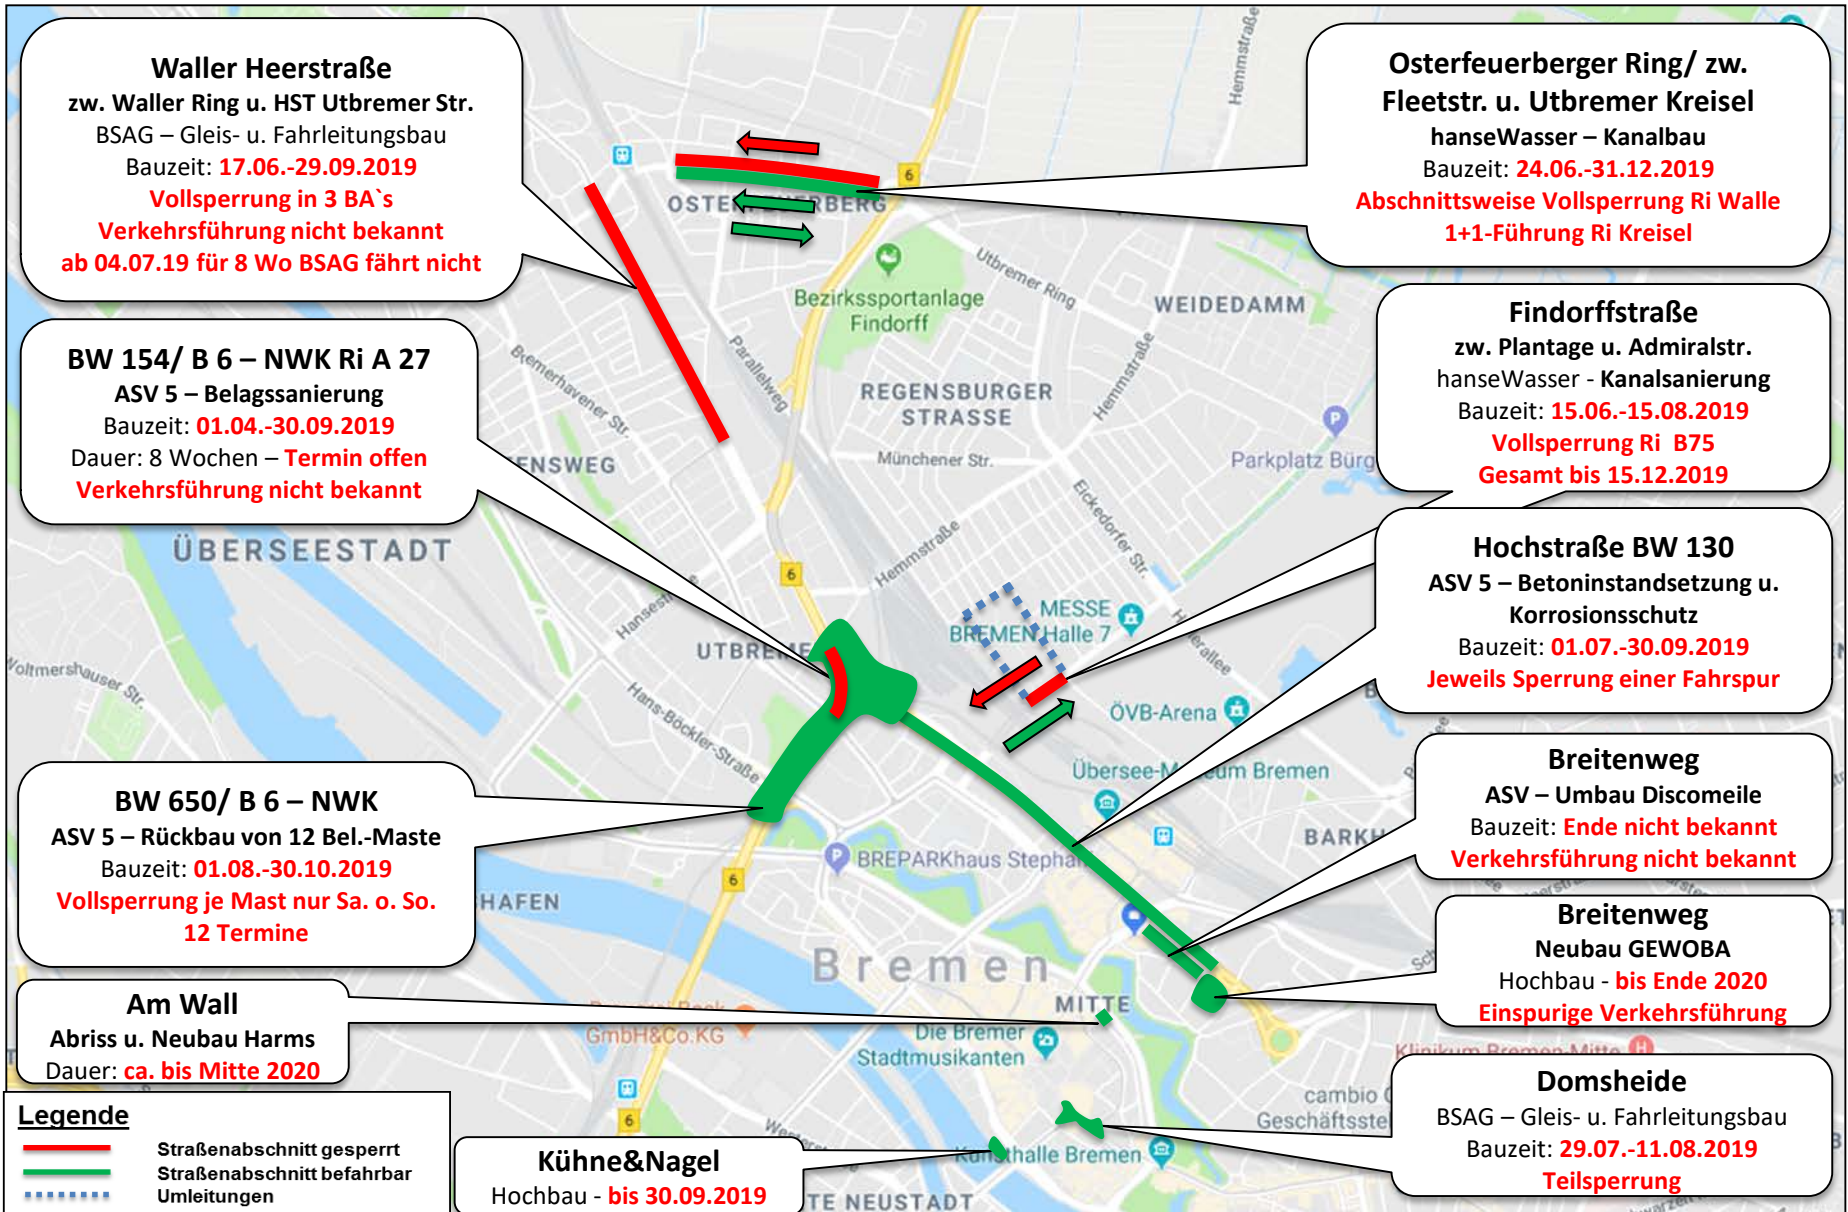


Baumaßnahmen ab August 2019
(Sommerferien 04.07.-14.08.2019 – Einschulung 17.08.2019)

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

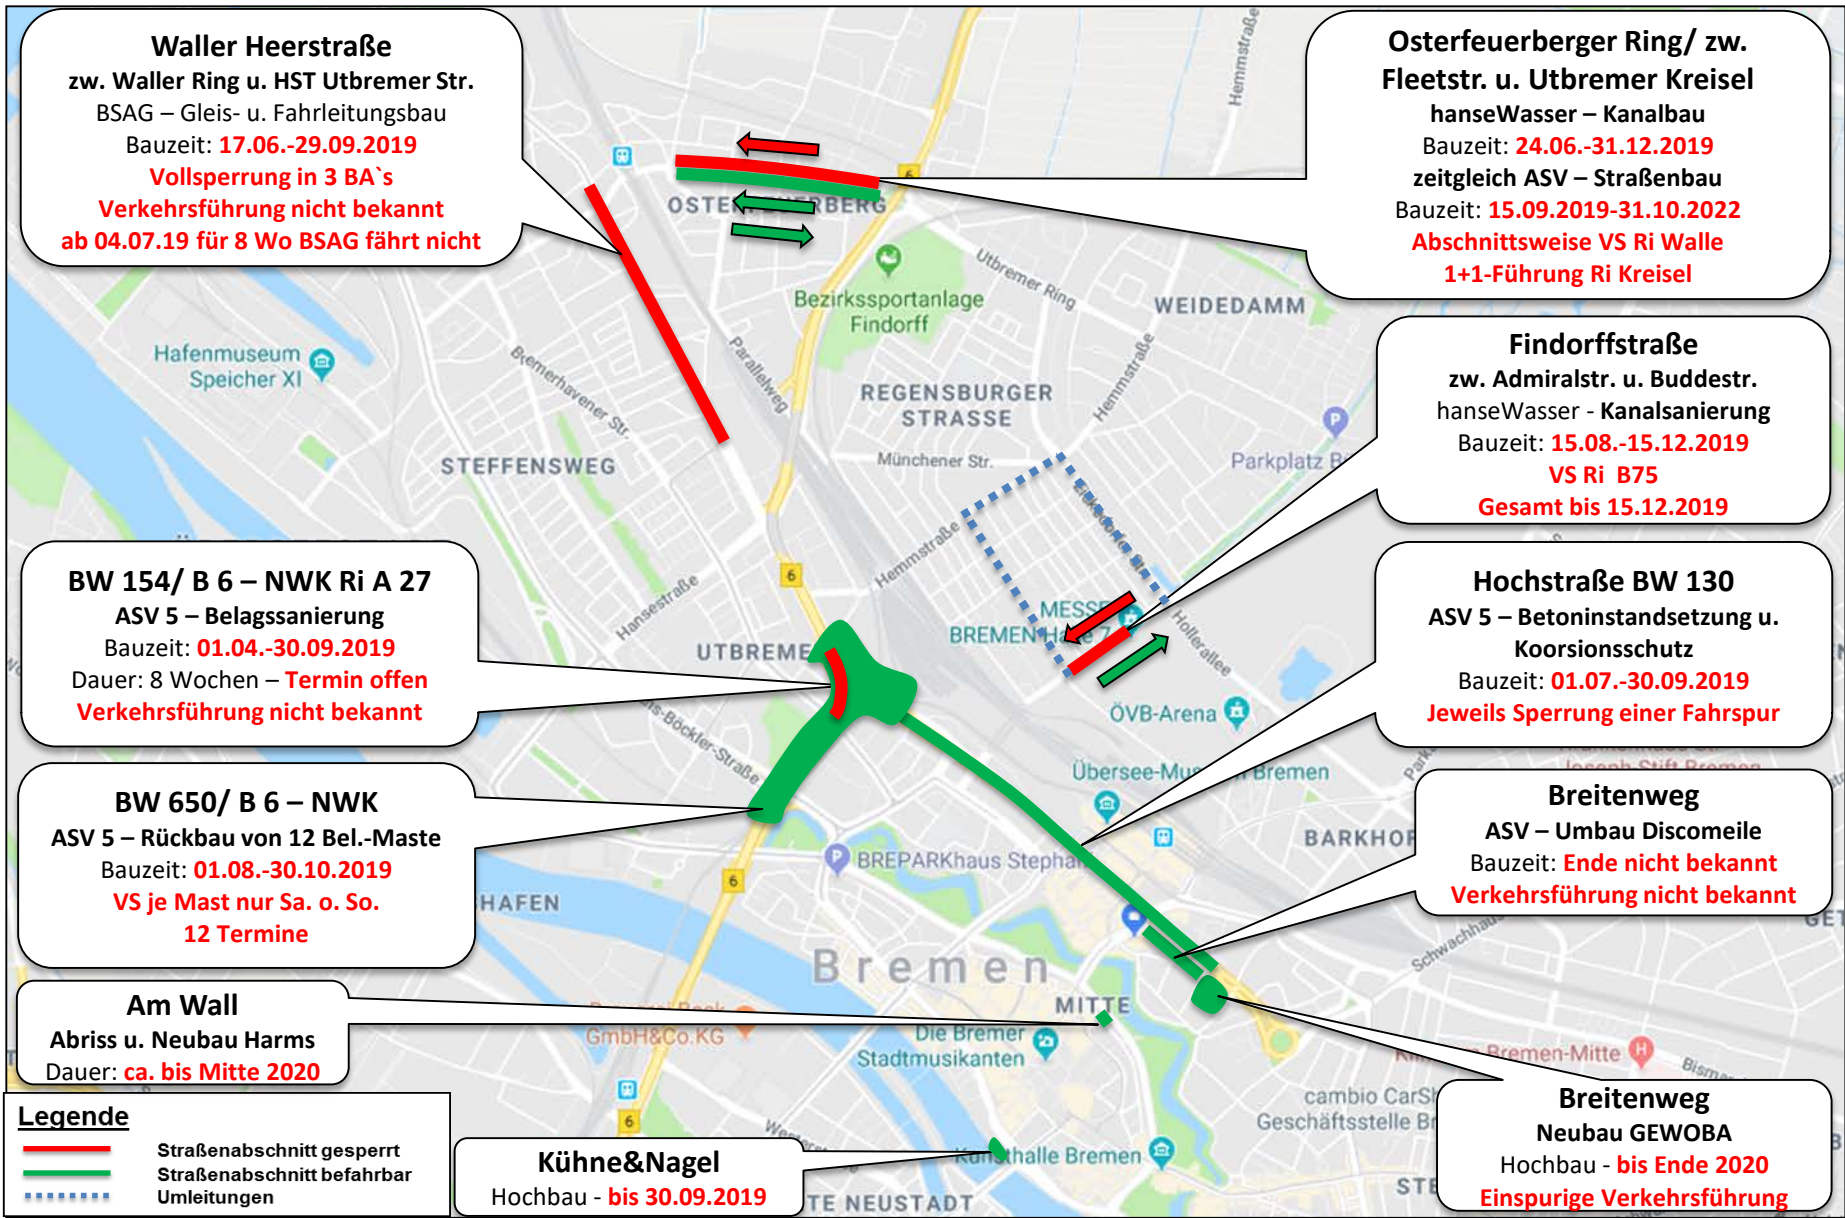


Baumaßnahmen ab September 2019

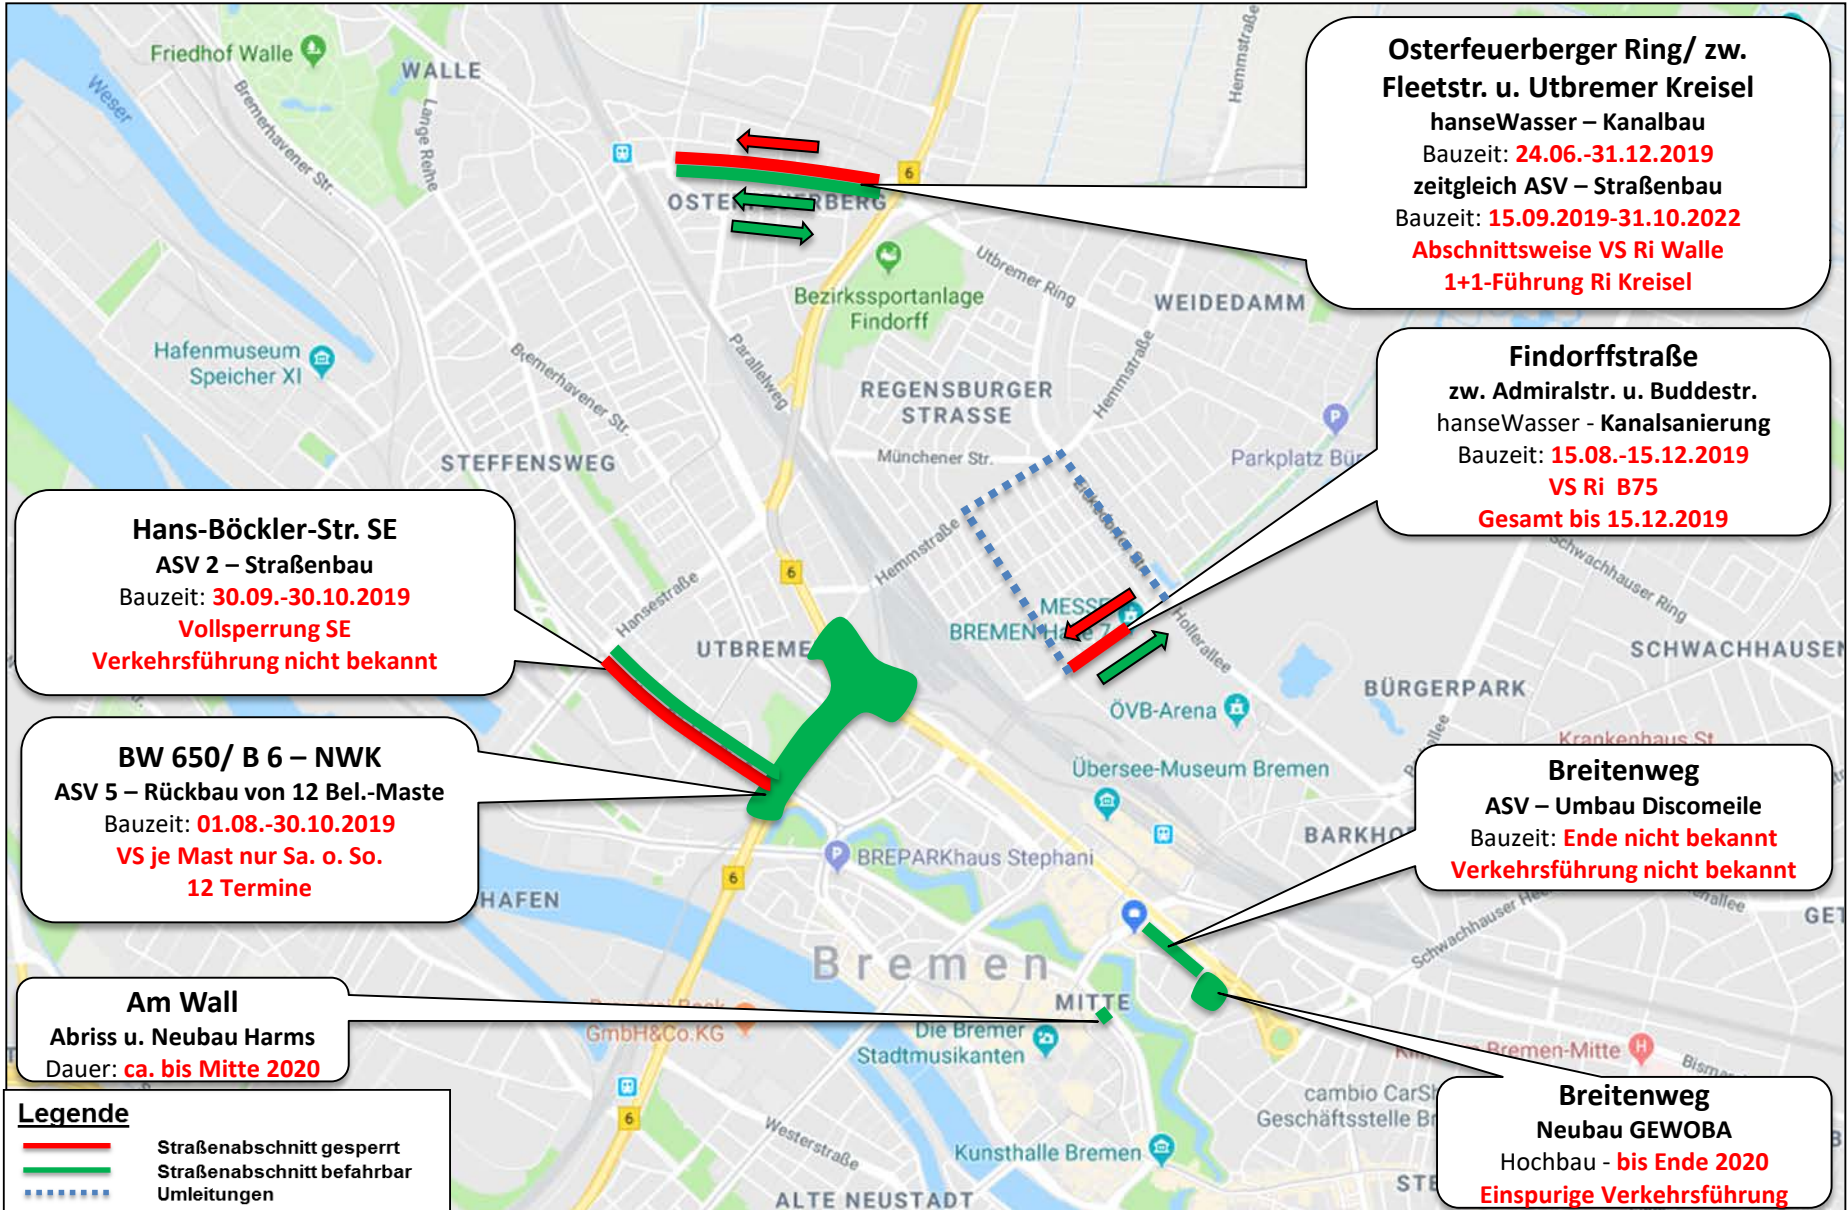

Baumaßnahmen ab Oktober 2019
(Herbstferien 04.-18.10.2019 + Freimarkt 18.10.-03.11.2019)

Baustellenverzeichnis 2019 - Innenstadtbereich und umzu

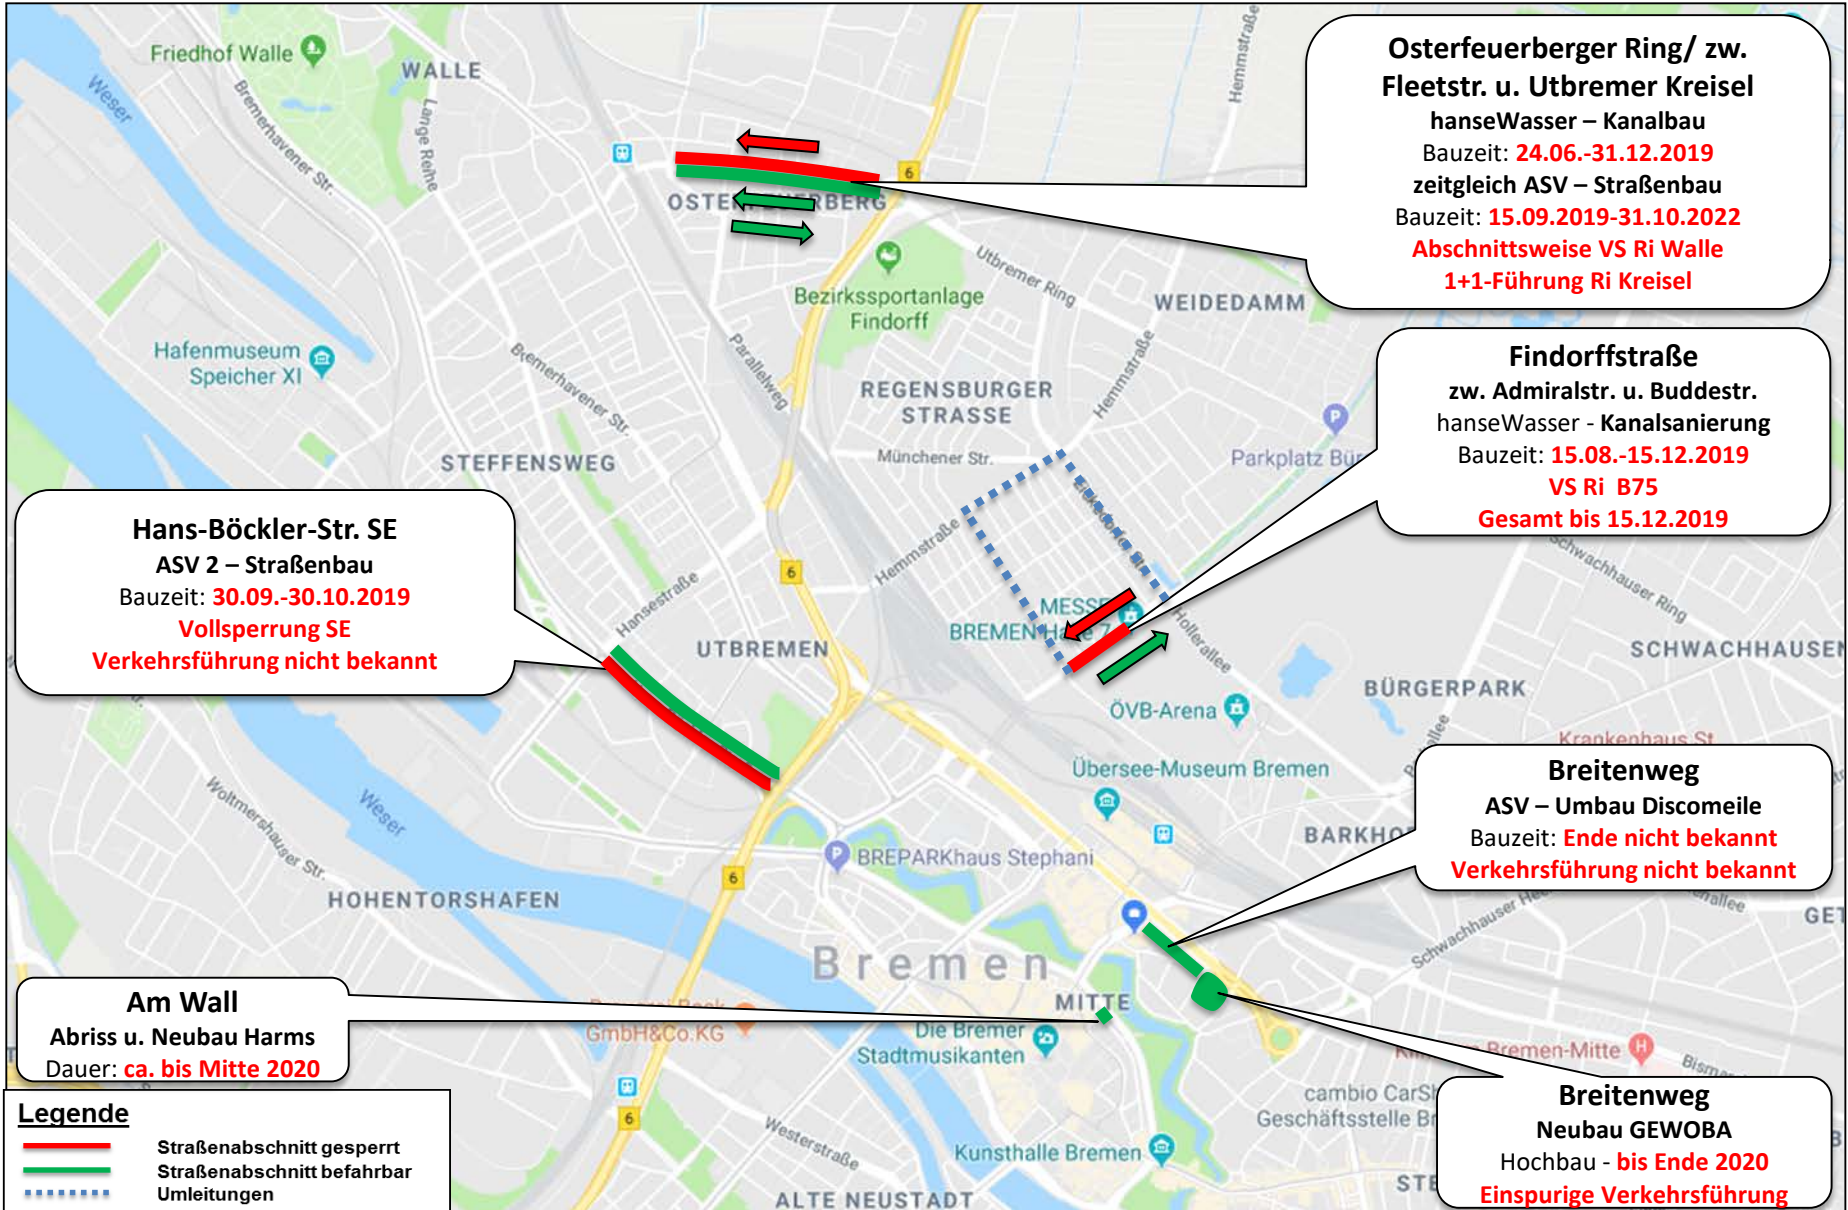

Baumaßnahmen ab November 2019


BAB 1 und 27

Inklusive Baumaßnahmen der


**Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr (NLStBV)**

mit


B 6/ B 75

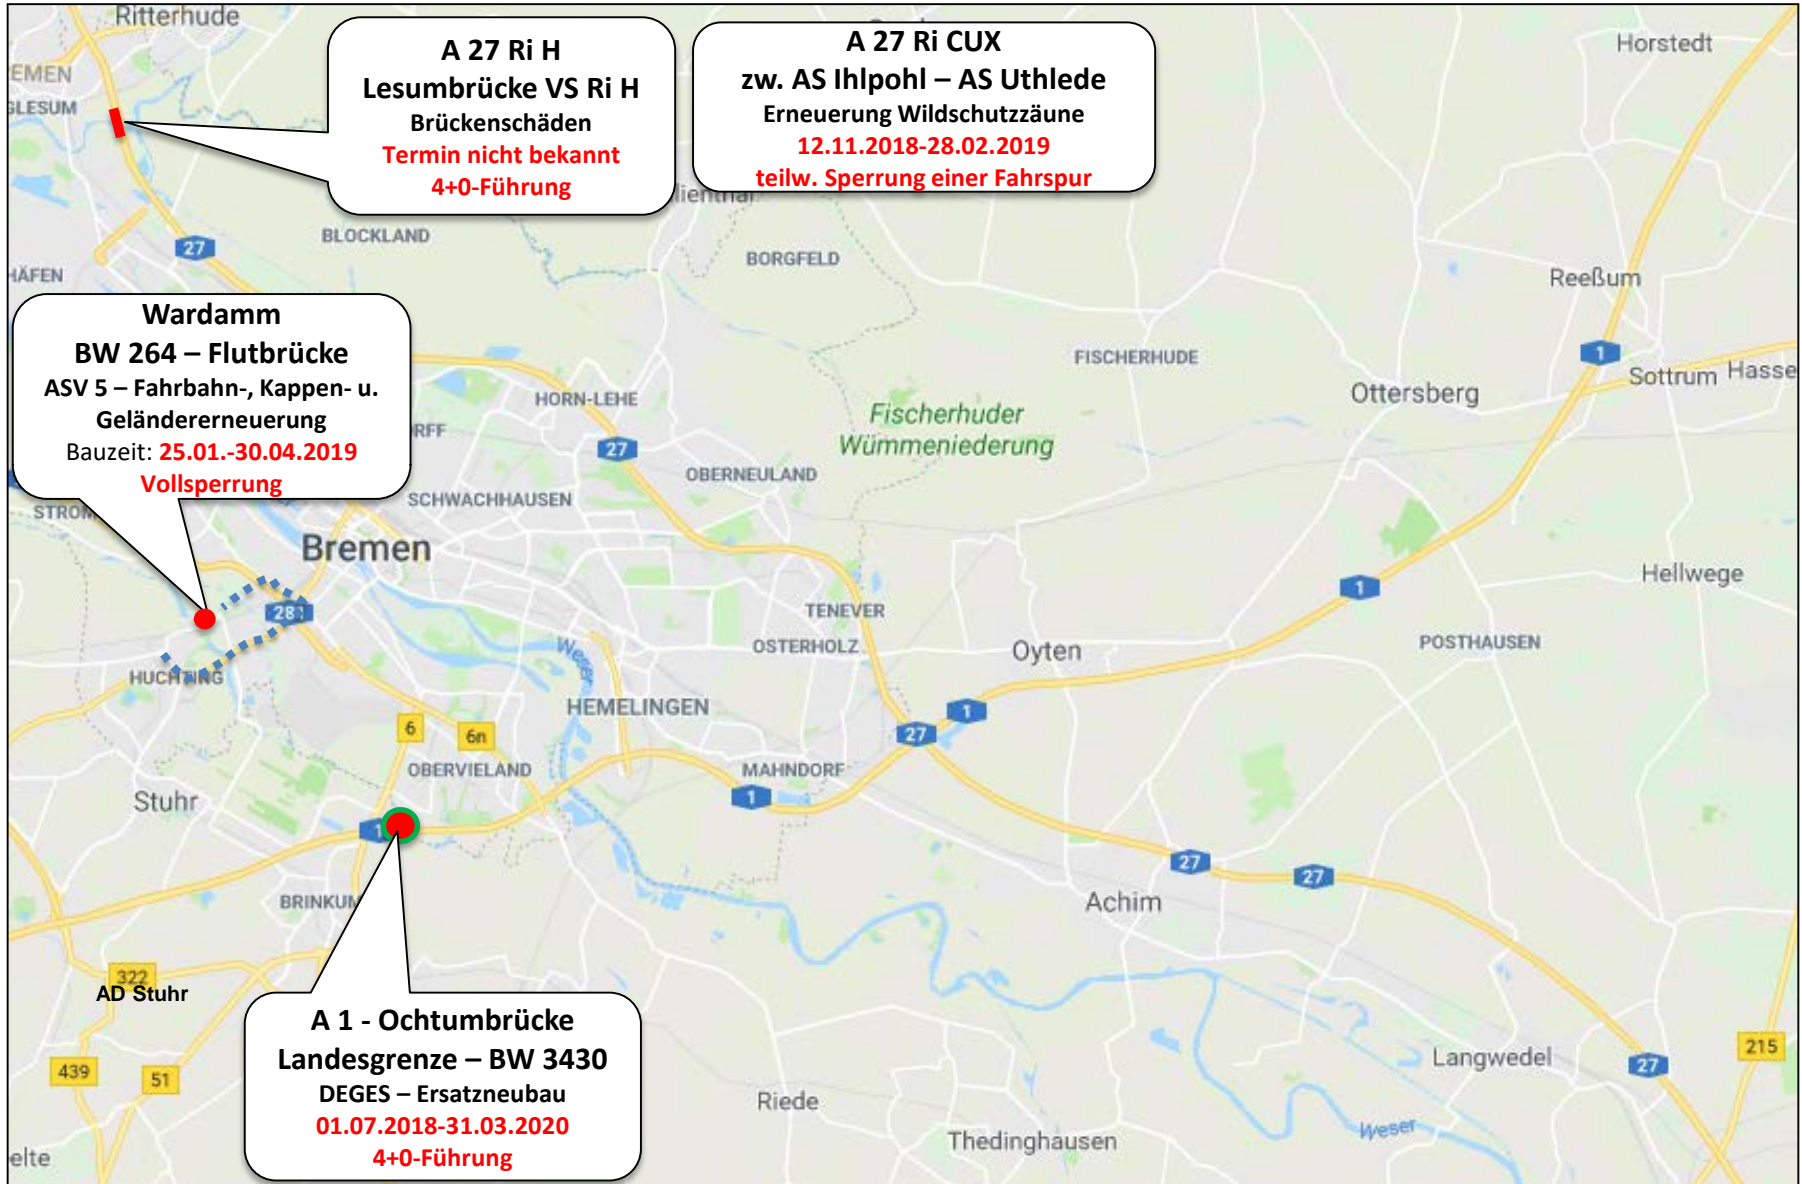

Baumaßnahmen im Bau

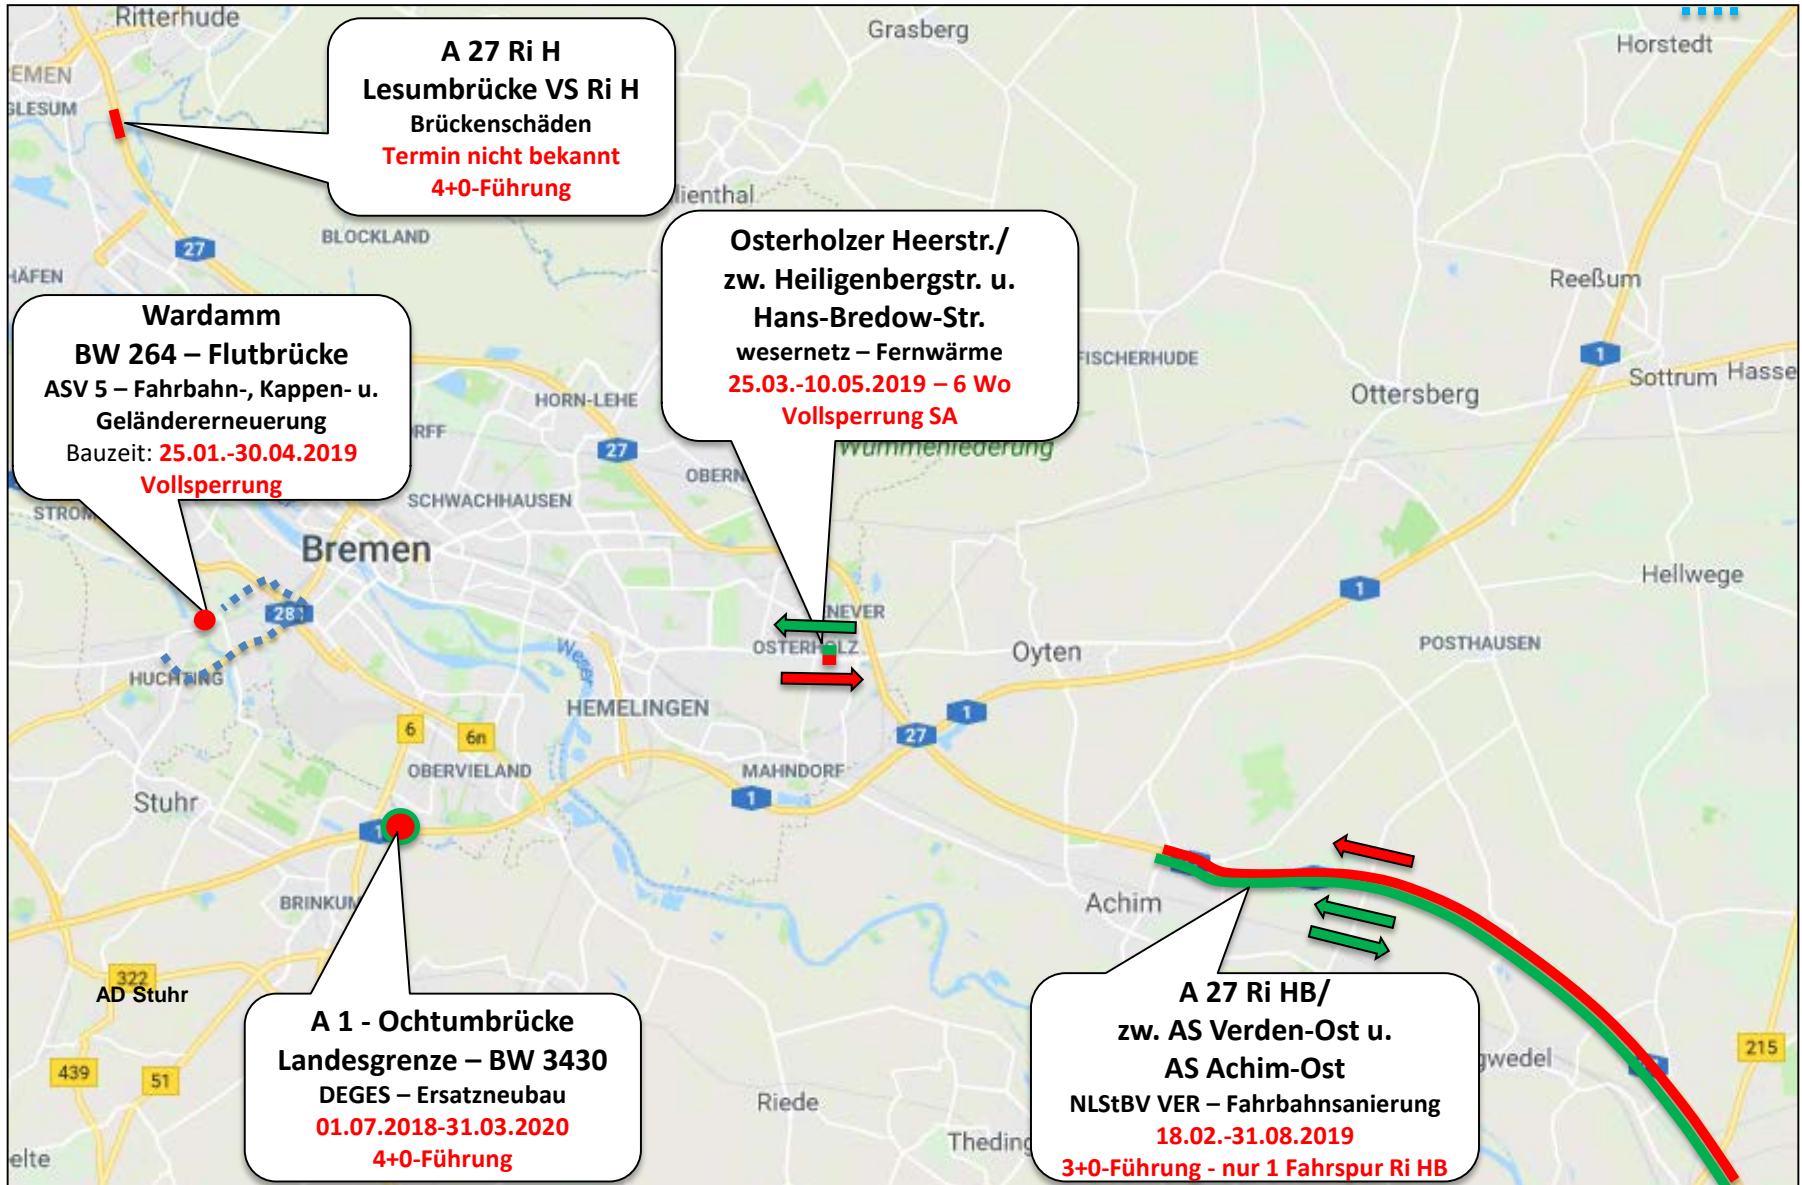


Baumaßnahmen im März 2019

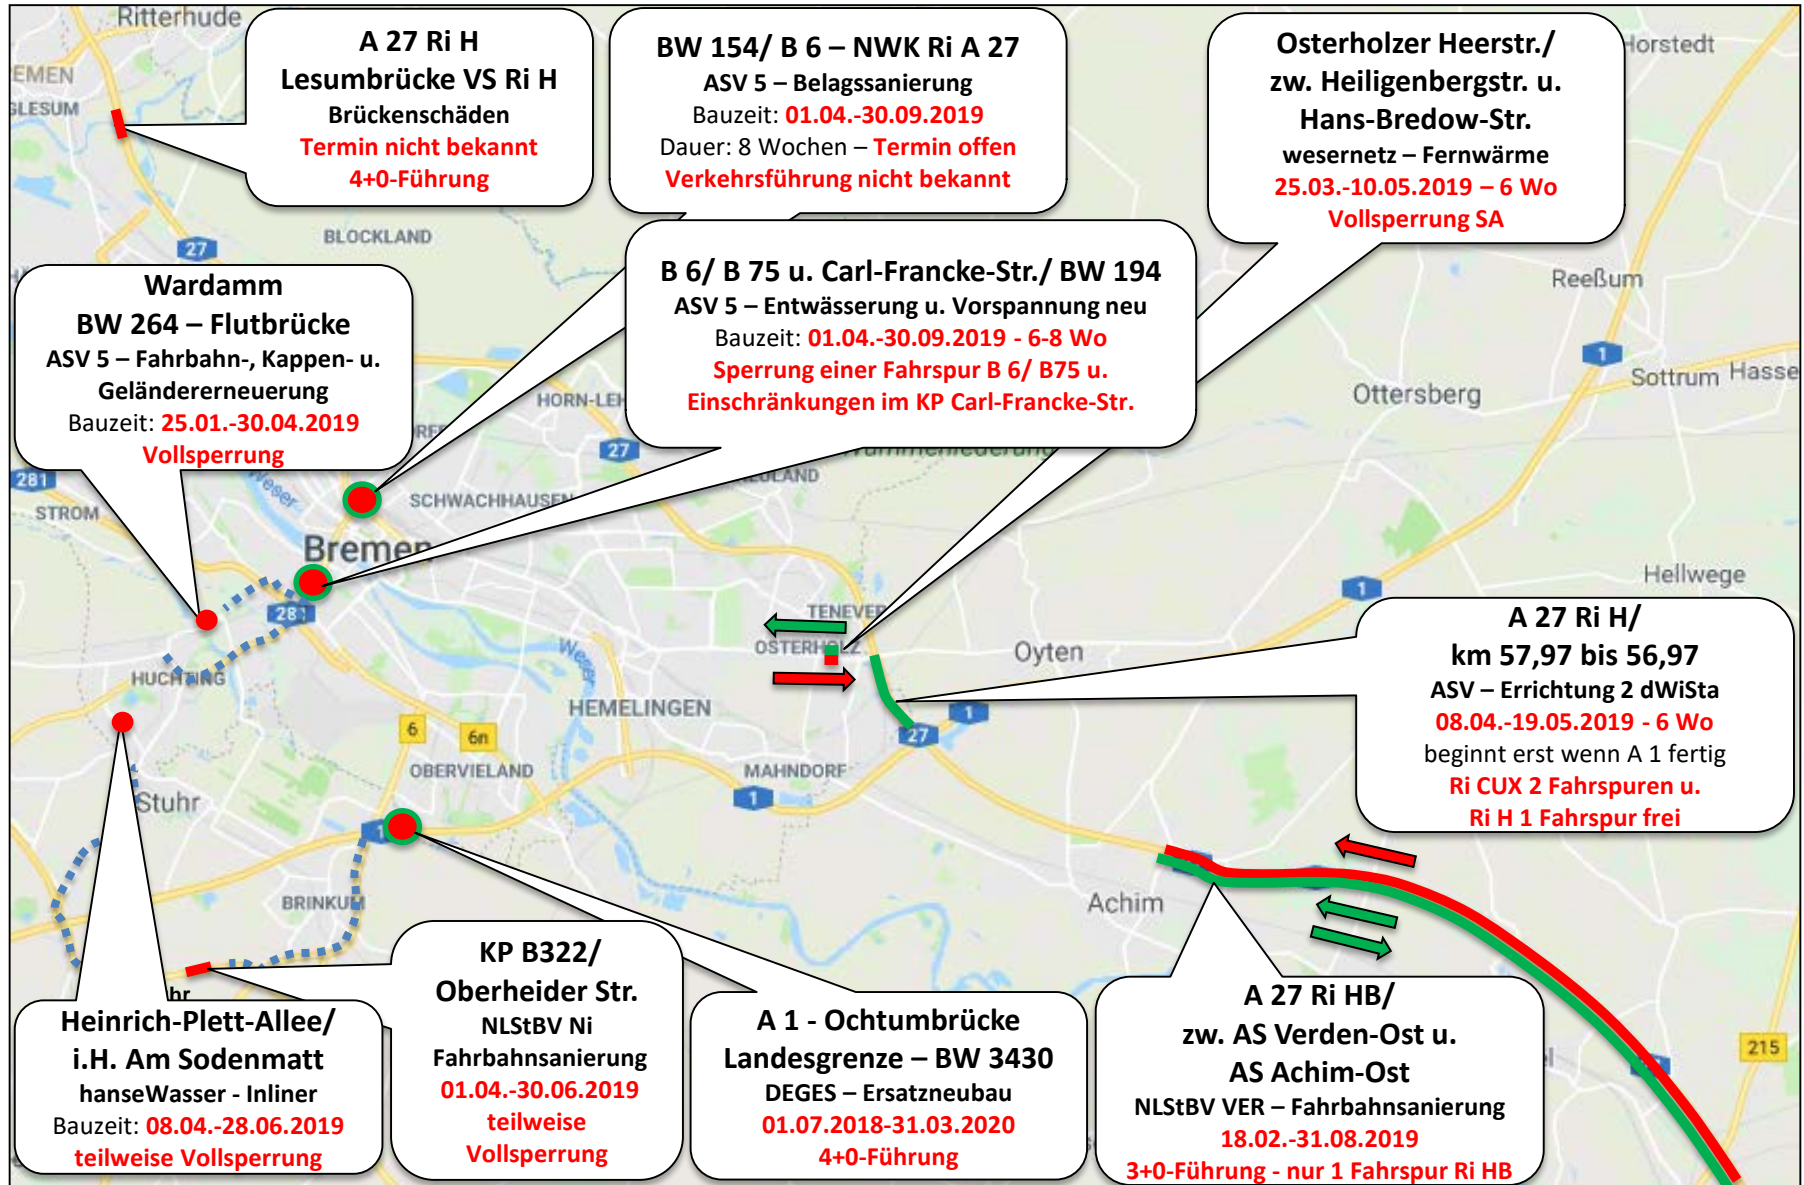

Baumaßnahmen im April 2019
(Osterferien 12.-28.04.2019)


Baustellenverzeichnis 2019 – BAB 1 u. 27 inkl. NLStBV + B 6/ B 75

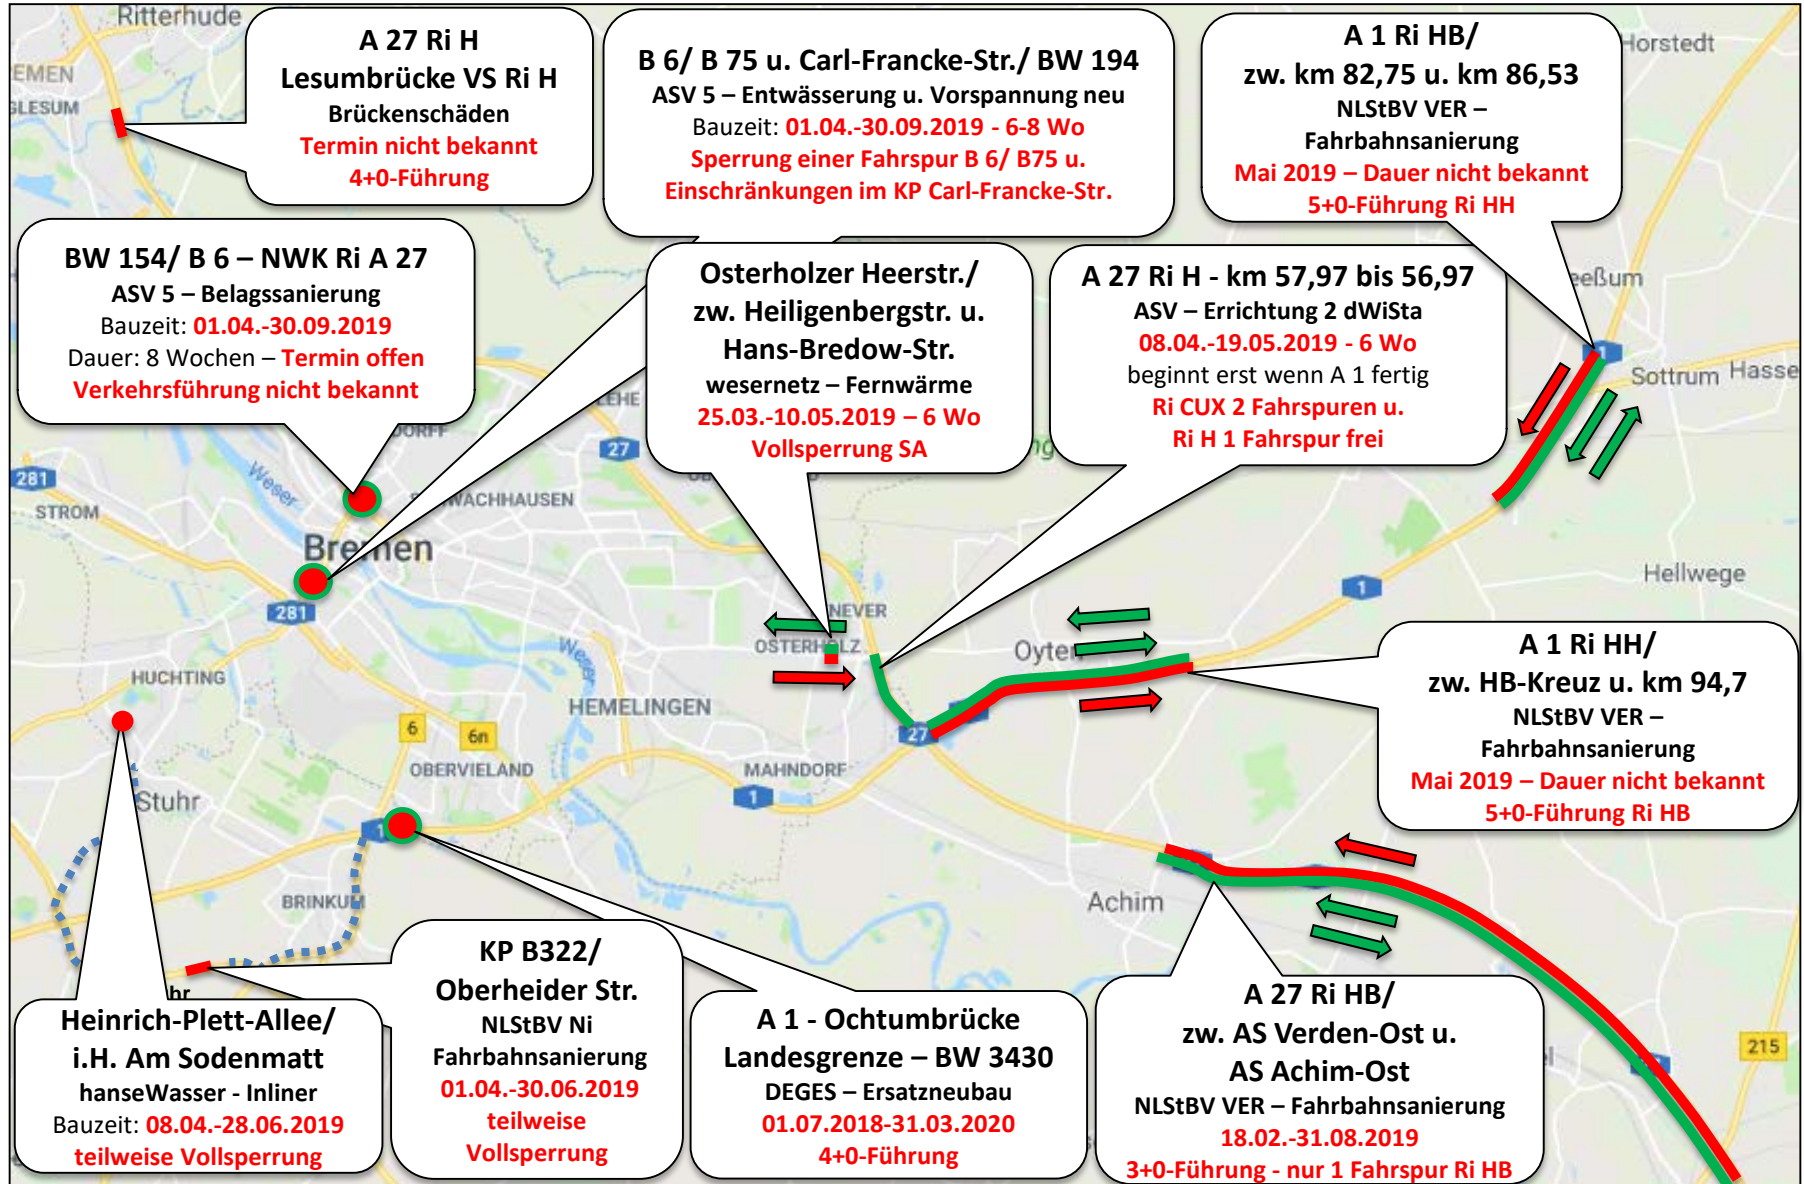


Baumaßnahmen im Mai 2019

Baustellenverzeichnis 2019 – BAB 1 u. 27 inkl. NLStBV + B 6/ B 75


Der Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr

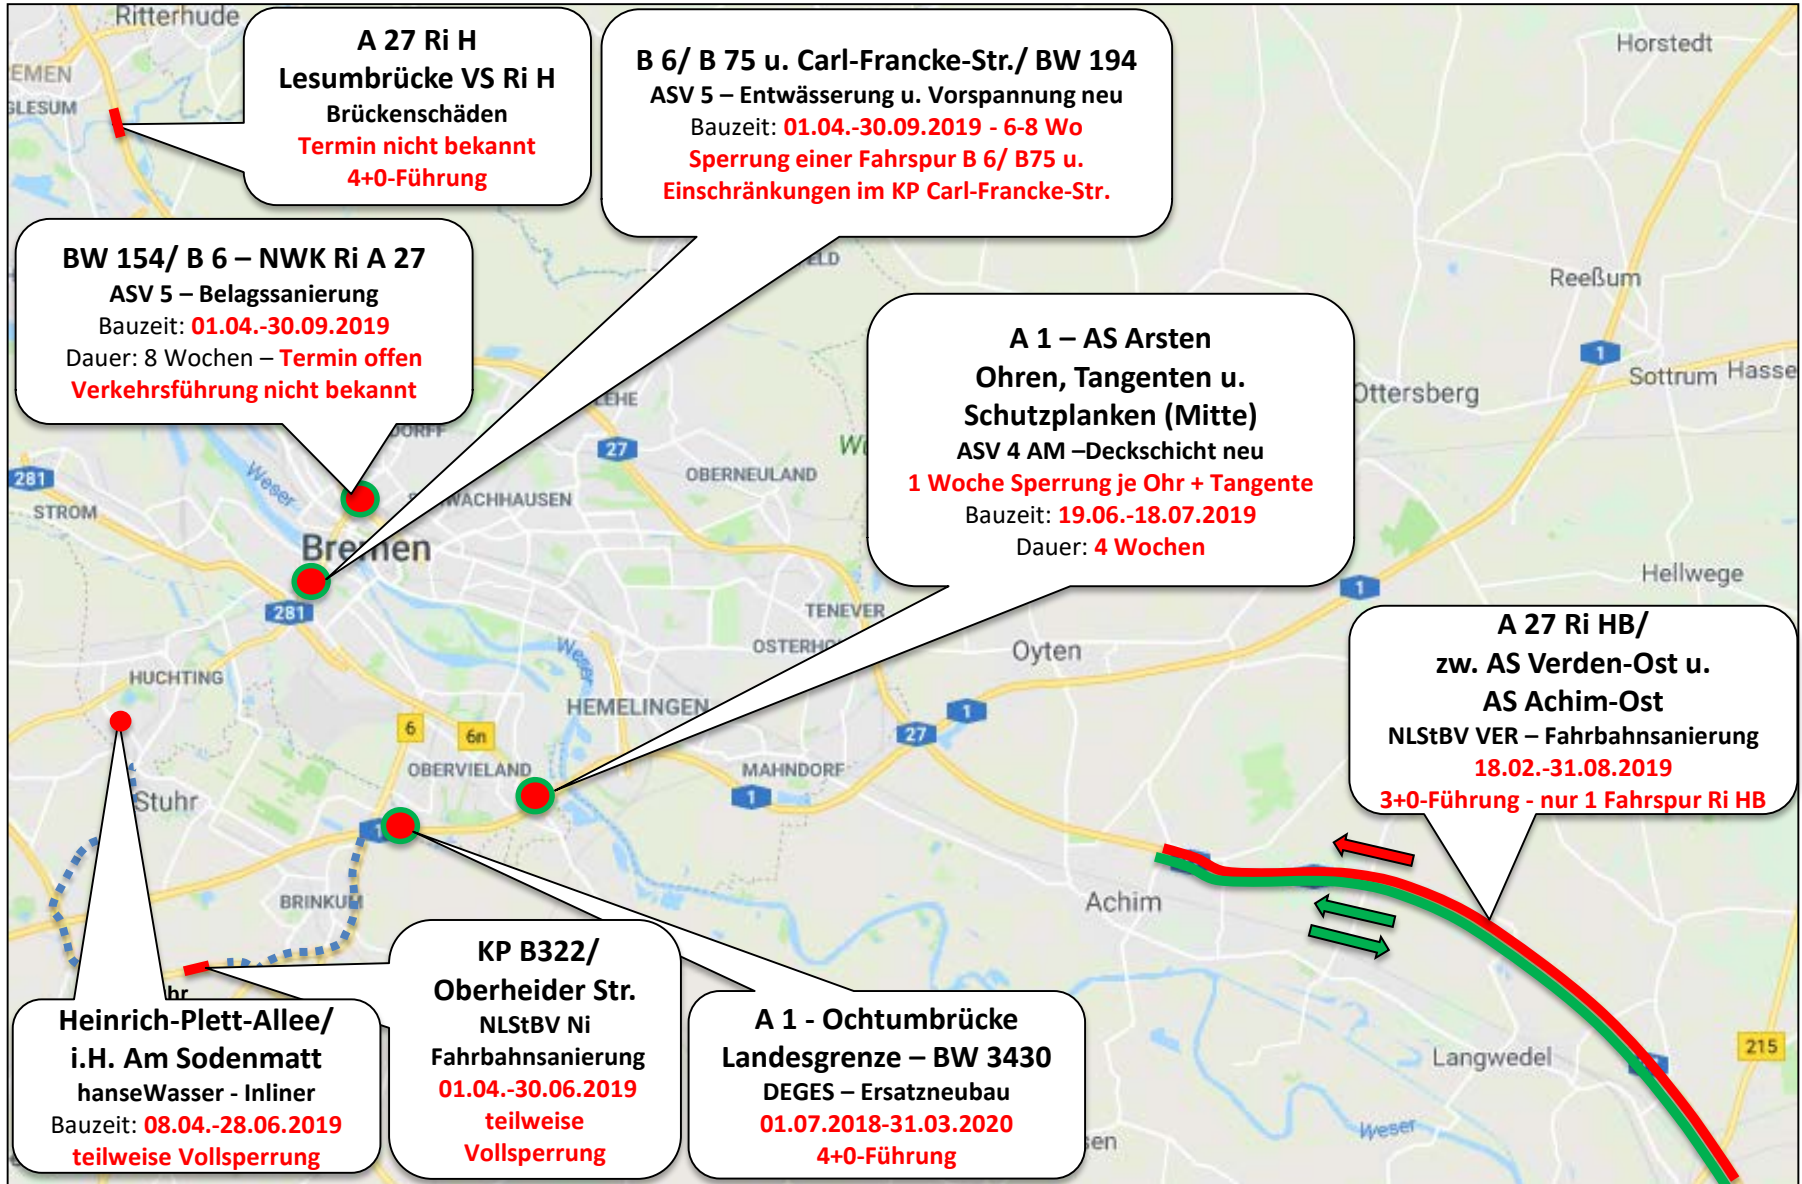

Baumaßnahmen im Juni 2019

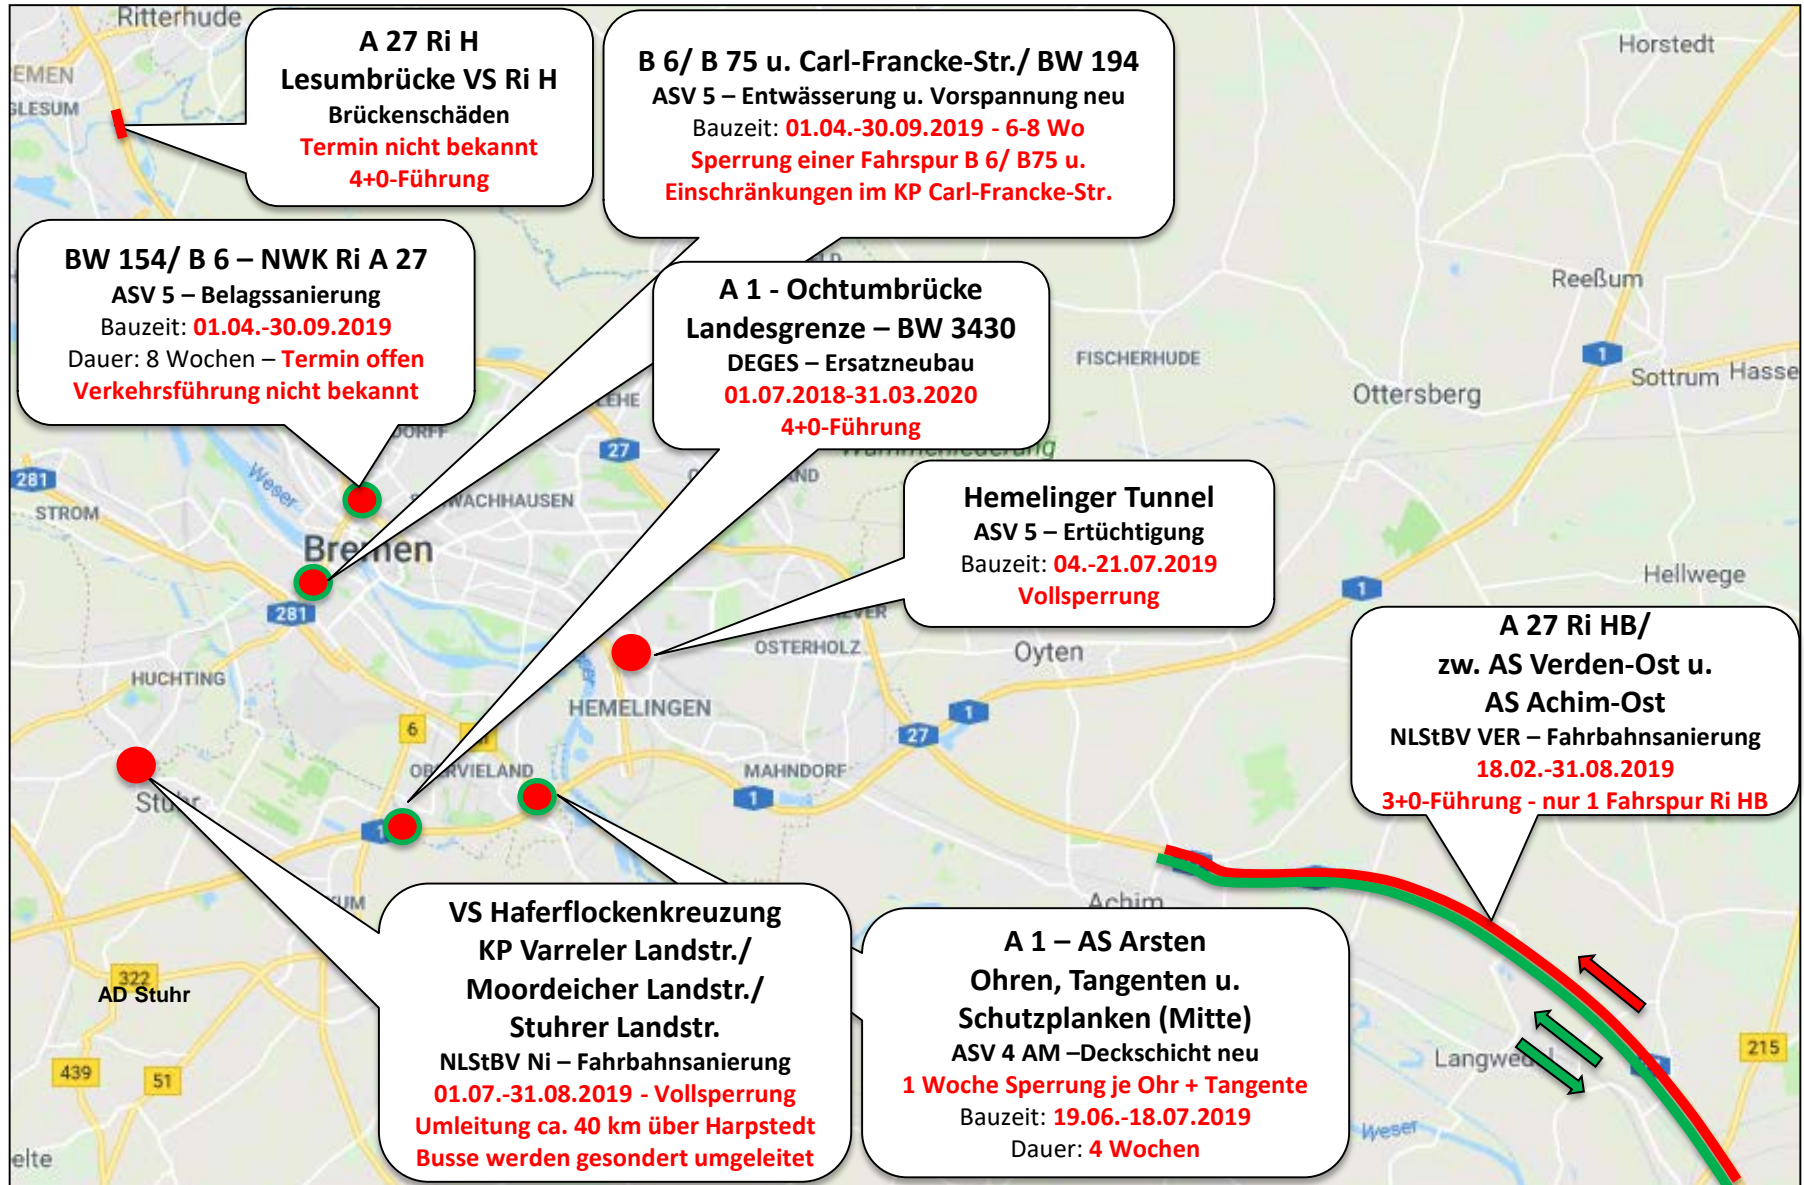


Baumaßnahmen Anfang Juli 2019
(Sommerferien 04.07.-14.08.2019)

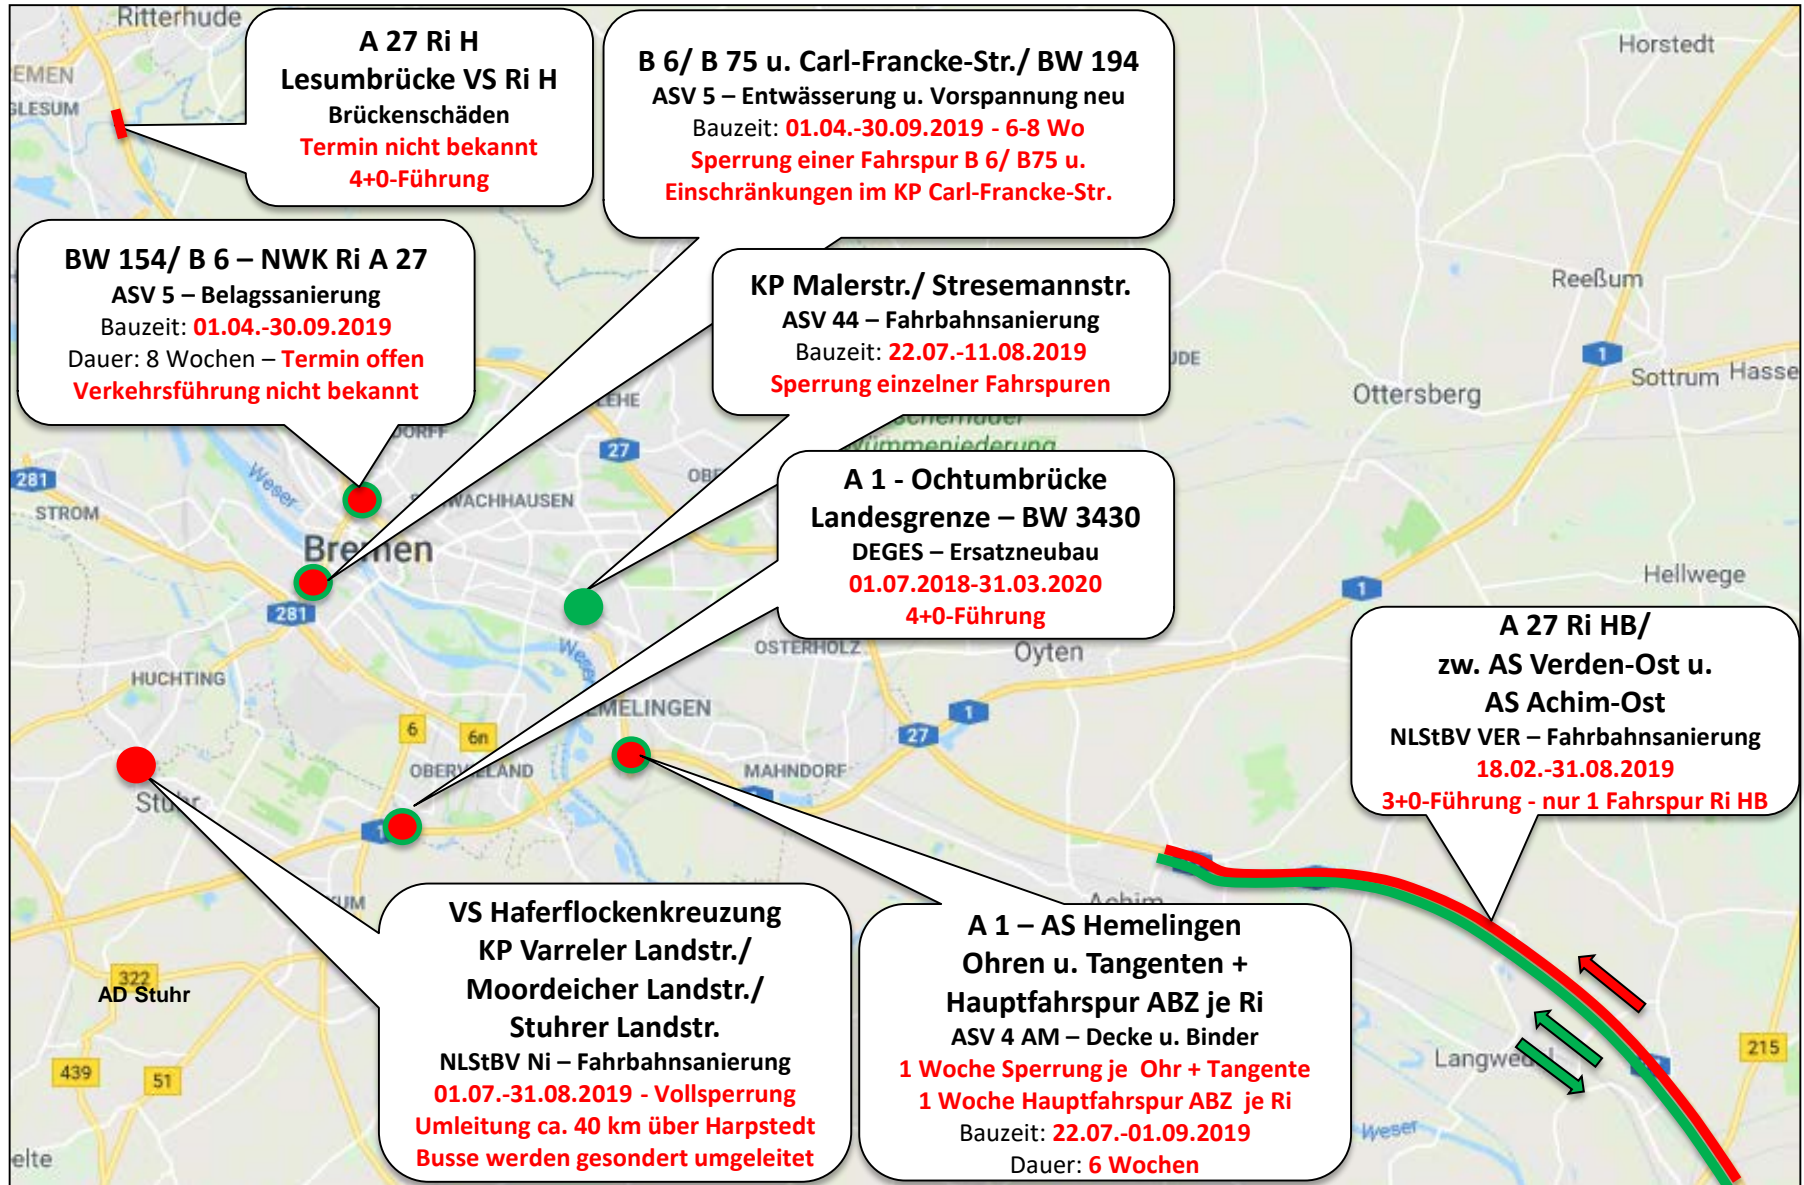


Baumaßnahmen Ende Juli – August 2019

(Sommerferien 04.07.-14.08.2019)

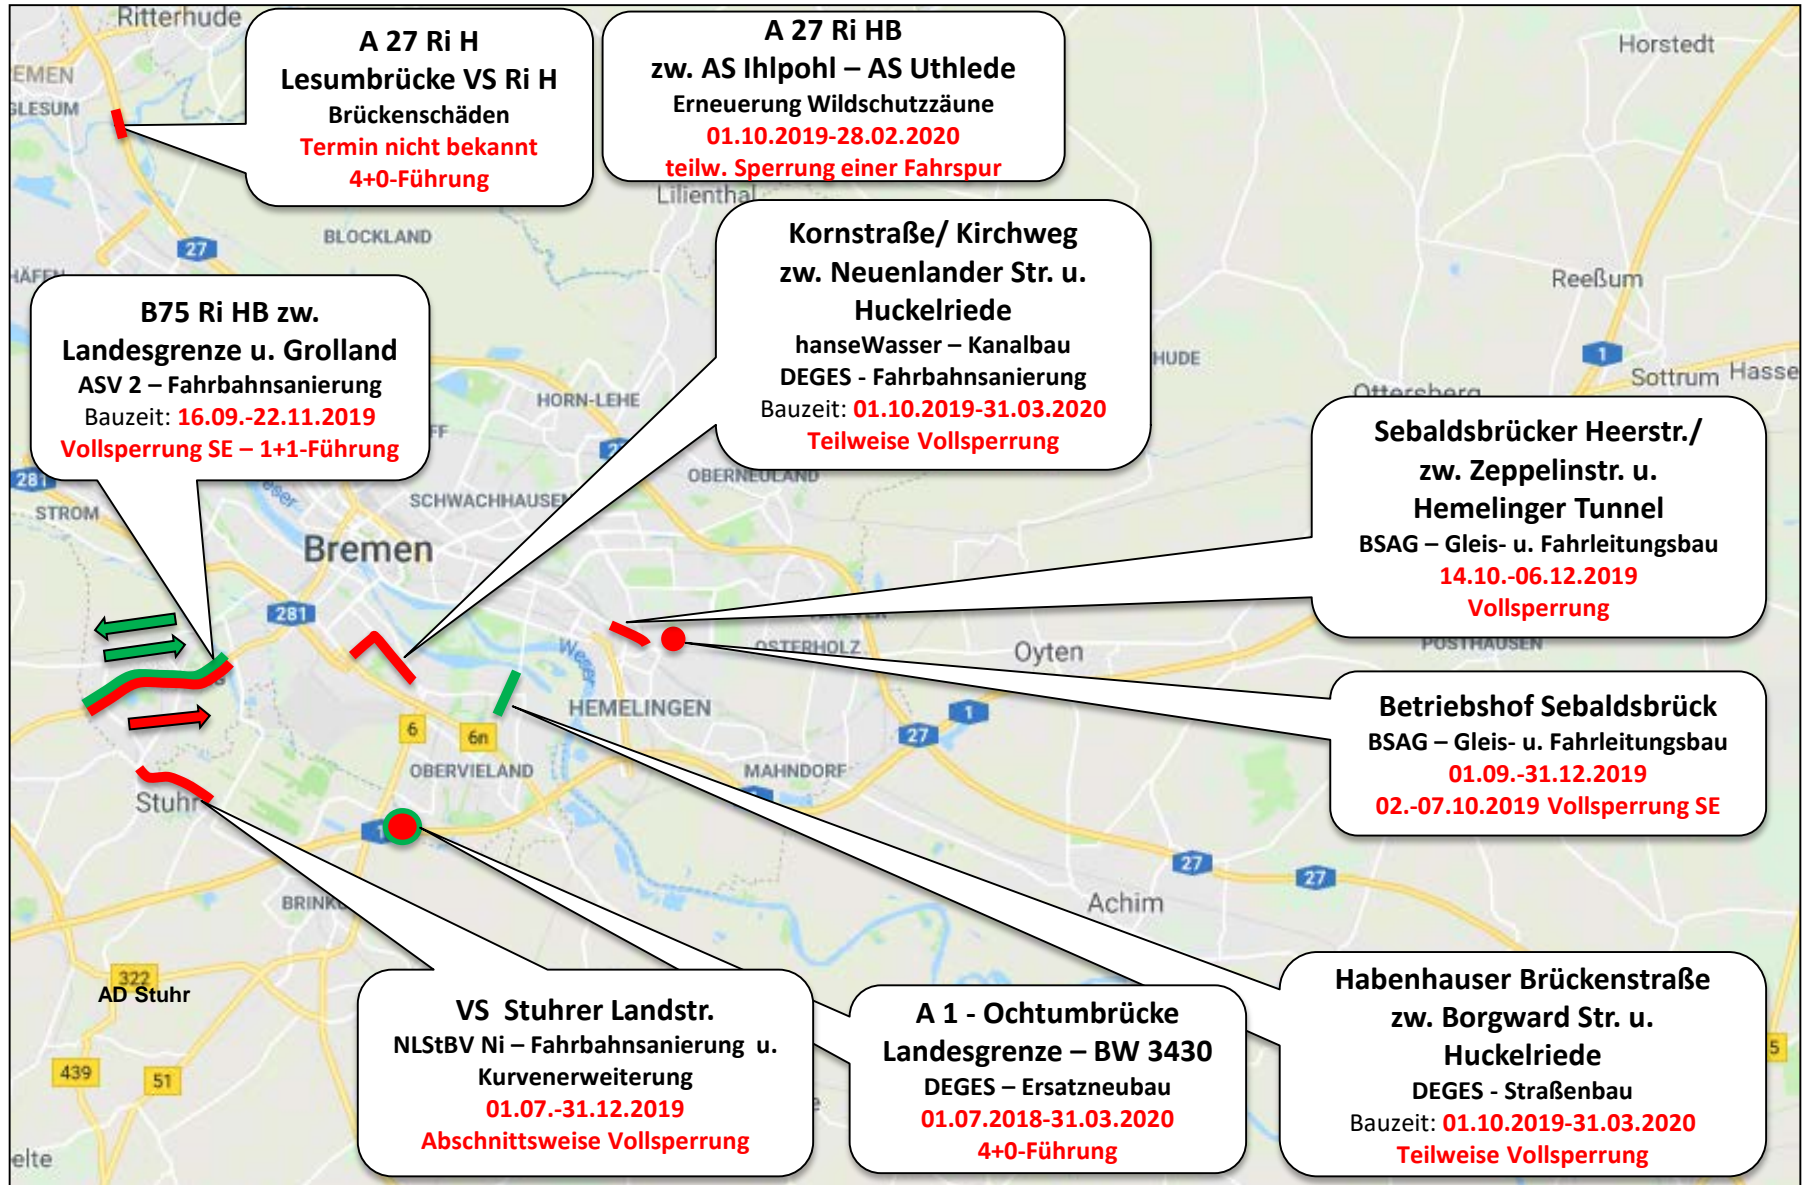

Baumaßnahmen im Oktober und November 2019

(Herbstferien 04.-18.10.2019)

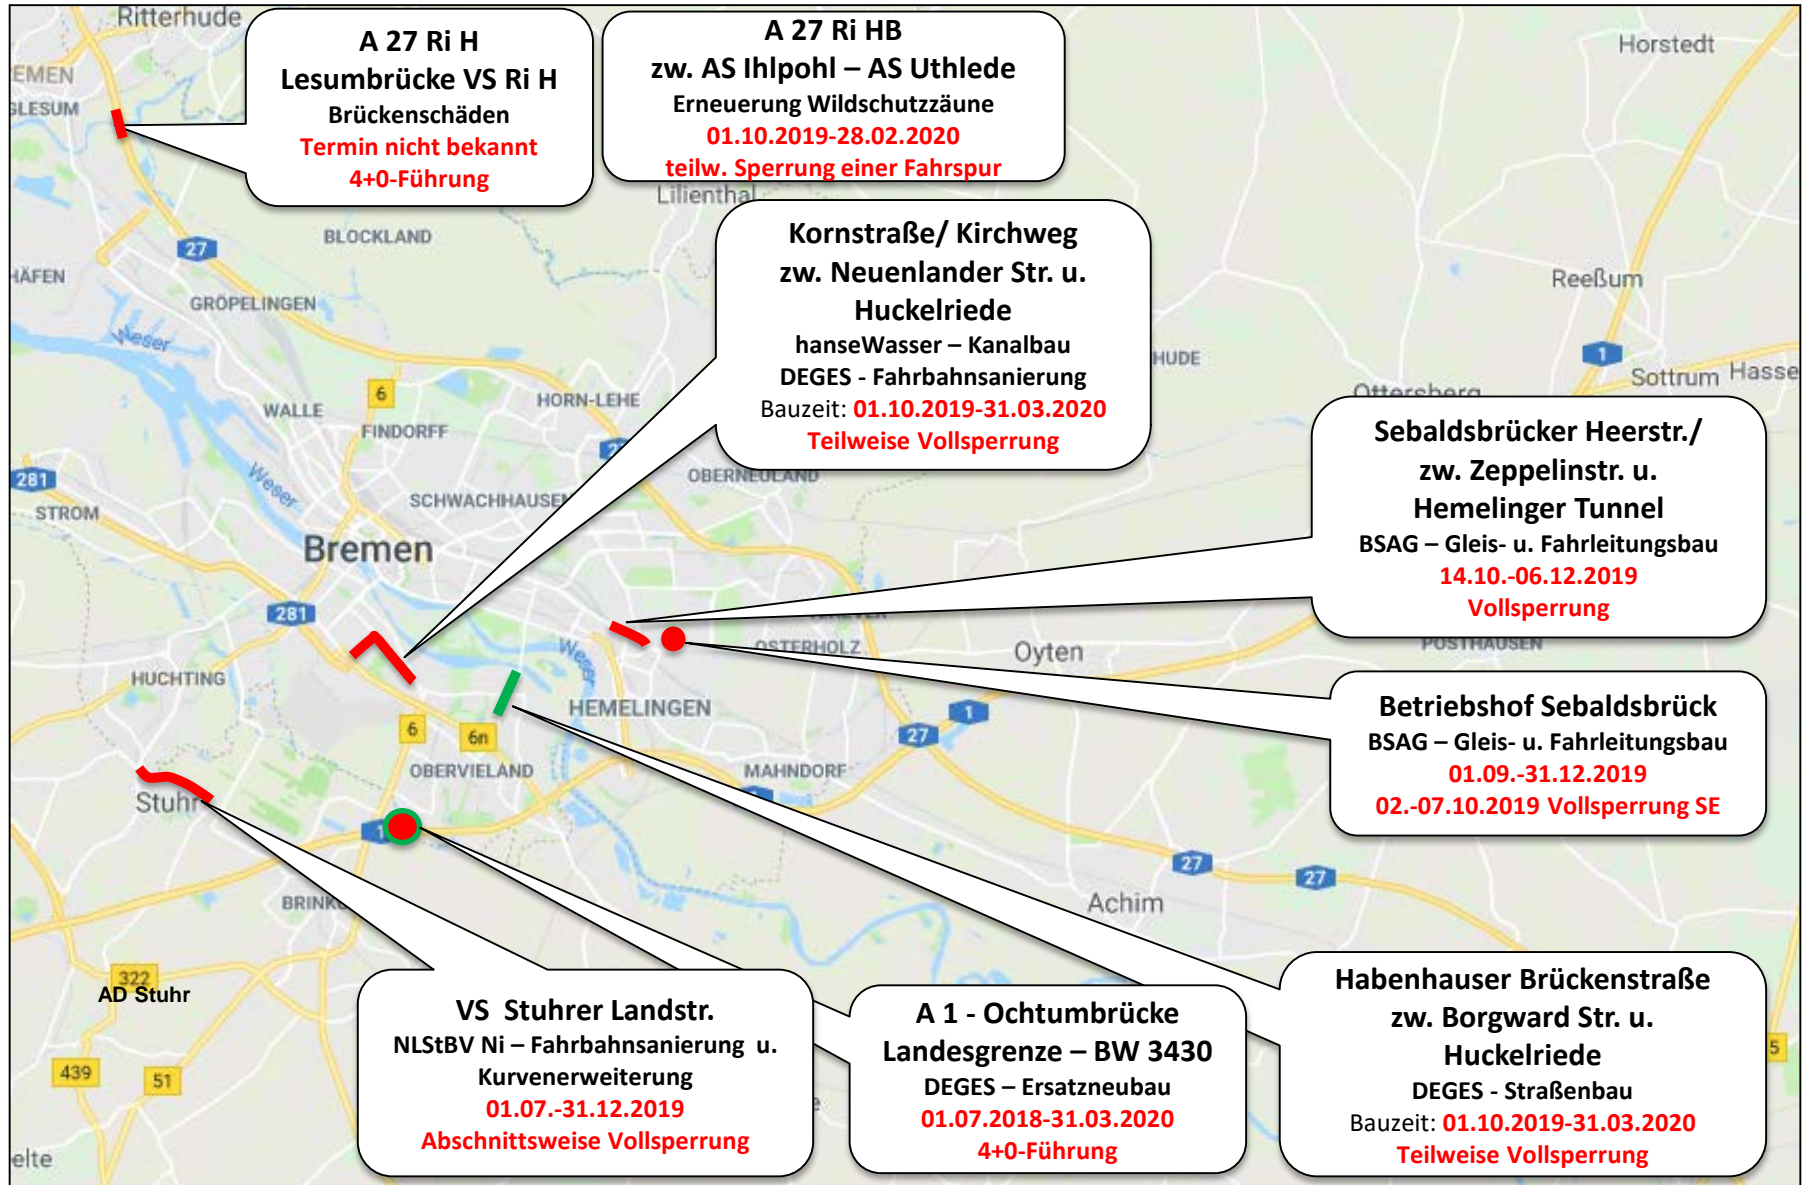

Baumaßnahmen im Dezember 2019

Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit

VIIEEN DANK FÜR IHR AUFMERKSAMKEIT

Dipl.-Ing. Gabriele Schulenburg
Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Abteilung 5 - Verkehr
Referat 51 - Baustellenkoordination
Contrescarpe 72
Dienststz: Contrescarpe 73
28195 Bremen
Tel.: (0421) 361-10 702
E-Mail: baustellenkoordination@bau.bremen.de

